

Relatório de Gestão Centro Carioca de Diagnóstico

Outubro / 2022

Prestação de Contas Mensal
Centro Carioca de Diagnóstico
Novembro de 2022

SUMÁRIO

1.	Introdução:	3
2.	Relatório Assistencial	4
2.1	Adequações da estrutura física.....	4
2.2	Recursos humanos.....	12
2.3	Equipamentos	16
2.4	Sistemas de informação.....	20
2.5	Implantação das unidades avançadas.....	26
2.6	Oficialização do serviço nos órgãos competentes	75
2.7	Plano de implantação do processo de trabalho da unidade	75
2.8	Termos de referência e Contratos	80
3.	Considerações Finais	81

Centro de Diagnóstico Carioca

Acompanhamento
de ações e entregas



1. INTRODUÇÃO

Através do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2022, assinado aos vinte e sete dias do mês de maio de 2022, celebrado entre O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO GNOSIS, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, com sede na Avenida das Américas nº 11.889, Barra da Tijuca, CEP nº 22.793-082, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, com o objeto do gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do **CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - UNIDADES SEDE E AVANÇADAS**, de forma a assegurar assistência universal e gratuita à população, única e exclusivamente para o Sistema Único de Saúde – SUS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município do Rio de Janeiro, a partir de 01/06/2022 até 31/05/2024.

O projeto tem por objetivo fomentar o Serviço de Diagnóstico em regime de mútua cooperação com o Instituto Gnosis, através da celebração de Termo de Colaboração, na busca de viabilizar um serviço mais moderno em tecnologia, de alta resolutividade e inovações sendo referência na especialidade da rede de atenção à saúde da capital carioca.

O Centro Diagnóstico Carioca (CDC) tem sua sede localizada na região central da cidade, na Área de Planejamento (AP) 1.0, na Rua Dr. Rodrigues de Santana nº 53, Bairro de Benfica, e destina-se ao recebimento de usuários do Sistema Único de Saúde, referenciados por unidades da rede pública de Saúde, para realização de procedimentos diagnósticos e exames de imagem.

Após a inauguração deverá contar com exames de média a alta complexidade como Radiografia simples e contrastada, Ultrassonografia com Doppler, Tomografia Computadorizada (Multislice), Angiotomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Ressonância Magnética com sedação, Angiorressonância, Ecocardiografia com Doppler, Doppler Vascular, Mamografia, Densitometria Óssea, Broncoscopia, Colonoscopia, Videolaringoscopia e Biópsias (mama, próstata, tireóide, etc.).

O Centro também contará com Unidades Avançadas, com 3 (três) especificações tipológicas distintas, que estão distribuídas entre as 10 (dez) AP, objetivando a ampliação do acesso aos serviços aos demais bairros cariocas, com exames de média complexidade como Radiografia simples e Tomografia Computadorizada.

De acordo com a Resolução do CFM nº 1.886/2008, publicada no D.O.U. de 21 de novembro de 2008, o estabelecimento será classificado como Unidade tipo II, com as seguintes características:

- É o estabelecimento de saúde, independente de um hospital, destinado à realização de procedimentos clínico-cirúrgicos de pequeno e médio porte, com condições para internações de curta permanência, em salas cirúrgicas adequadas a essa finalidade;
- Deverá contar com salas de recuperação ou de observação de pacientes;
- Realiza exames /procedimentos de pequeno e médio porte, sob anestesia loco-regional (com exceção dos bloqueios subaracnóideo e peridural), com ou sem sedação;
- O pernoite, quando necessário, será feito em hospital de apoio;
- É obrigatório garantir a referência para um hospital de apoio.

2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades desenvolvidas pelas unidades avançadas e, CCD no período compreendido no mês de novembro 2022, relacionado ao Termo de Colaboração celebrado entre a SMS e o Instituto Gnosis.

Tendo em vista que durante todo o período do início do contrato até o mês de novembro, o Centro Carioca Diagnóstico esteve em obra para adequação de sua infraestrutura, foi dada continuidade ao planejamento de execução das atividades pelas devidas áreas.

Apresentaremos a seguir o andamento das adequações da estrutura física, contratação e manutenção de recursos humanos, aquisição, entrega, montagem e instalação de equipamentos e mobiliários, além de insumos e medicamentos. Distribuição de uniformes e crachás, realização de treinamentos, implantação do processo de trabalho nas unidades avançadas entre outros.

2.1 Adequações da estrutura física:

A obra do CCD – Centro Carioca de Diagnóstico encontra-se em andamento, tendo ocorrido uma pausa de aproximadamente 15 dias, para ajuste do Projeto Básico junto ao GEA. Durante esses dias deu-se continuidade a realização de serviços que não dependiam das alterações previstas para projeto, tais como instalação da rede ar-condicionado, retirada das grades da recepção, ramificações da parte elétrica, demolições, blindagem das salas com barita no pavimento térreo, entre outros.

Abaixo Relatório Diário de Obra da empresa terceirizada Bravo, responsável pela execução do projeto.

Relatório Diário de Obra

Número RDO	000663	Data	24/10/2022	Dia da semana	Segunda-feira
Obra/serviço	199 - CCD Benfica	Proprietário	Instituto Gnosis		
Endereço	Rua General Gustavo Cordeiro de Farias 545 Benfica - Rio de Janeiro	CEP	20910-220		
Início	18/07/2022	Previsão de término	30/11/2022	Prazo (dias)	135
Tempo decorrido	98	Saldo prazo	37		
Resp. técnico		ART nº			
Responsável					
Obs					

Turno/Tempo		
Manhã	Tarde	Noite
Limpo/aberto	Limpo/aberto	Limpo/aberto

Tarefas		
Fase/Serviço	Descrição	Medição
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS/	Impermeabilização do piso	
ALVENARIA E DIVISÓRIAS/	Execução de alvenaria	

Ocorrências

Imagens

Equipe envolvida			
Nome	Função	Quantidade	Expediente
	Engenheiro Civil	2,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Eletricista	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Técnico de Segurança	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Encarregado de compras	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Encarregado de Obras	2,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Assistente administrativo	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Bombeiro Hidráulico	9,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Ajudante	31,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Pedreiro	2,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Eletricista	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Vigia	1,0000	19:00-00:00 01:00-07:00

Relatório Diário de Obra

Máquinas e equipamentos				
Equipamento	Fase	Serviço	Quantidade	Duração
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 4CM	1,0000	8,0000
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		2,0000	8,0000
COLHER PEDREIRO	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		5,0000	1,0000
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		1,0000	1,0000

Materiais recebidos		
Insumo	Quantidade	Unidade

Materiais utilizados				
Insumo	Quantidade	Unidade	Fase	Serviço
Cimento CP III - 50KG	5,0000	SC	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	
Tijolo cerâmico furado de vedação	200,0000	Unidades	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	

Assinatura	

Relatório Diário de Obra

Número RDO	000659	Data	25/10/2022	Dia da semana	Terça-feira
Obra/serviço	199 - CCD Benfica	Proprietário	Instituto Gnosis		
Endereço	Rua General Gustavo Cordeiro de Farias 545 Benfica - Rio de Janeiro	CEP	20910-220		
Início	18/07/2022	Previsão de término	30/11/2022	Prazo (dias)	135
Tempo decorrido	99	Saldo prazo	36		
Resp. técnico		ART nº			
Responsável					
Obs					

Turno/Tempo		
Manhã	Tarde	Noite
Limpo/aberto	Limpo/aberto	Limpo/aberto

Tarefas		
Fase/Serviço	Descrição	Medição
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS/	Continuação da impermeabilização do piso	
ALVENARIA E DIVISÓRIAS/	Continuação de execução de alvenaria	

Ocorrências

Imagens

Equipe envolvida			
Nome	Função	Quantidade	Expediente
	Engenheiro Civil	2,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Técnico de Segurança	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Encarregado de compras	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Encarregado de Obras	2,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Assistente administrativo	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Bombeiro Hidráulico	8,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Ajudante	35,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Pedreiro	3,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Eletricista	5,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Vigia	1,0000	19:00-00:00 01:00-07:00

Relatório Diário de Obra

Máquinas e equipamentos				
Equipamento	Fase	Serviço	Quantidade	Duração
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 4CM	1,0000	8,0000
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		2,0000	8,0000
COLHER PEDREIRO	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		5,0000	1,0000
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		1,0000	1,0000

Materiais recebidos		
Insumo	Quantidade	Unidade

Materiais utilizados				
Insumo	Quantidade	Unidade	Fase	Serviço
Cimento CPIII - 50KG	5,0000	SC	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	
Tijolo cerâmico furado de vedação	200,0000	Unidades	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	

Assinatura

Relatório Diário de Obra

Número RDO	000660	Data	26/10/2022	Dia da semana	Quarta-feira
Obra/serviço	199 - CCD Benfica	Proprietário	Instituto Gnosis		
Endereço	Rua General Gustavo Cordeiro de Farias 545 Benfica - Rio de Janeiro			CEP	20910-220
Início	18/07/2022	Previsão de término	30/11/2022	Prazo (dias)	135
Tempo decorrido	100	Saldo prazo	35		
Resp. técnico		ART nº			
Responsável					
Obs					

Turno/Tempo		
Manhã	Tarde	Noite
Limpo/aberto	Limpo/aberto	Limpo/aberto

Tarefas		
Fase/Serviço	Descrição	Medição
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS/CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM	Instalação do contrapiso	
ALVENARIA E DIVISÓRIAS/	finalização de alvenaria	

Ocorrências

Imagens

Equipe envolvida			
Nome	Função	Quantidade	Expediente
	Engenheiro Civil	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Técnico de Segurança	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Encarregado de compras	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Encarregado de Obras	2,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Assistente administrativo	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Ajudante	32,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Bombeiro Hidráulico	8,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Eletricista	3,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Pedreiro	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Vigia	1,0000	19:00-00:00 01:00-07:00

Relatório Diário de Obra

Máquinas e equipamentos				
Equipamento	Fase	Serviço	Quantidade	Duração
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM	1,0000	8,0000
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		2,0000	8,0000
COLHER PEDREIRO	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		5,0000	1,0000
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		1,0000	1,0000

Materiais recebidos		
Insumo	Quantidade	Unidade

Materiais utilizados				
Insumo	Quantidade	Unidade	Fase	Serviço
Cimento CP III - 50KG	5,0000	SC	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	
Tijolo ceramico furado de vedacao	200,0000	Unidades	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	

Assinatura

Relatório Diário de Obra

Número RDO	000661	Data	27/10/2022	Dia da semana	Quinta-feira
Obra/serviço	199 - CCD Benfica	Proprietário	Instituto Gnosis		
Endereço	Rua General Gustavo Cordeiro de Farias 545 Benfica - Rio de Janeiro	CEP	20910-220		
Início	18/07/2022	Previsão de término	30/11/2022	Prazo (dias)	135
Tempo decorrido	101	Saldo prazo	34		
Resp. técnico		ART nº			
Responsável					
Obs					

Turno/Tempo		
Manhã	Tarde	Noite
Limpo/aberto	Limpo/aberto	Limpo/aberto

Tarefas		
Fase/Serviço	Descrição	Medição
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS/	Instalação de granito	
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS/REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA, (LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010	Instalação de azulejo de cerâmica nos banheiros	

Ocorrências

Imagens

Equipe envolvida			
Nome	Função	Quantidade	Expediente
	Engenheiro Civil	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Técnico de Segurança	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Comprador	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Auxiliar Administrativo	2,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Ajudante	21,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Bombeiro Hidráulico	8,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Eletricista	4,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Pedreiro	2,0000	07:00-12:00 13:00-17:00

Relatório Diário de Obra

Máquinas e equipamentos				
Equipamento	Fase	Serviço	Quantidade	Duração
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 4CM	1,0000	8,0000
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		2,0000	8,0000
COLHER PEDREIRO	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		5,0000	1,0000
MARTELETE 6KG COM PONTEIRA E TALHADEIRA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		1,0000	1,0000

Materiais recebidos		
Insumo	Quantidade	Unidade

Materiais utilizados				
Insumo	Quantidade	Unidade	Fase	Serviço
Cimento CPIII - 50KG	5,0000	SC	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	
Tijolo ceramico furado de vedacao	200,0000	Unidades	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	

Assinatura

Relatório Diário de Obra

Número RDO	000662	Data	28/10/2022	Dia da semana	Sexta-feira
Obra/serviço	199 - CCD Benfica	Proprietário	Instituto Gnosis		
Endereço	Rua General Gustavo Cordeiro de Farias 545 Benfica - Rio de Janeiro	CEP	20910-220		
Início	18/07/2022	Previsão de término	30/11/2022	Prazo (dias)	135
Tempo decorrido	102	Saldo prazo	33		
Resp. técnico		ART nº			
Responsável					
Obs					

Turno/Tempo		
Manhã	Tarde	Noite
Limpo/aberto	Limpo/aberto	Limpo/aberto

Tarefas		
Fase/Serviço	Descrição	Medição
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS/REVESTIMENTO DE PAREDES COM LAMINADO VENEZIANO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57) EXCLUSIVE CHAPISCO, EMBOCO, NATA DE CIMENTO OU ARGAMASSA COLANTE E ACABAMENTO	Emboço das paredes	

Ocorrências

Imagens

Equipe envolvida			
Nome	Função	Quantidade	Expediente
	Engenheiro Civil	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Técnico de Segurança	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Encarregado de compras	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Encarregado de Obras	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Auxiliar Administrativo	2,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Ajudante	31,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Eletricista	8,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Pedreiro	3,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Bombeiro Hidráulico	8,0000	07:00-12:00 13:00-17:00

Relatório Diário de Obra

Máquinas e equipamentos				
Equipamento	Fase	Serviço	Quantidade	Duração
TESTE 6KG COM LAMINADO VENEZIANO E TALHADEIRA	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 4CM	1,0000	8,0000
TESTE 6KG COM LAMINADO VENEZIANO E TALHADEIRA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		2,0000	8,0000
PEDEIREIRO	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		5,0000	1,0000
TESTE 6KG COM LAMINADO VENEZIANO E TALHADEIRA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		1,0000	1,0000

Materiais recebidos		
Insumo	Quantidade	Unidade

Materiais utilizados				
Insumo	Quantidade	Unidade	Fase	Serviço
Cimento CP III - 50KG	5,0000	SC	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	
Argamassa cerâmica furado de vedação	200,0000	Unidades	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	

Assinatura

Relatório Diário de Obra

Número RDO	000647	Data	31/10/2022	Dia da semana	Segunda-feira
Obra/serviço	199 - CCD Benfica	Proprietário	Instituto Gnosis		
Endereço	Rua General Gustavo Cordeiro de Farias 545 Benfica - Rio de Janeiro	CEP	20910-220		
Início	19/07/2022	Previsão de término	30/11/2022	Prazo (dias)	135
Tempo decorrido	105	Saldo prazo	30		
Resp. técnico		ART nº			
Responsável					
Obs					

Turno/Tempo		
Manhã	Tarde	Noite
limpo/aberto	limpo/aberto	limpo/aberto

Fase/Serviço	Tarefas	Descrição	Medição
ESTRUTURA DE PAREDES, TETOS E ISOS/REVESTIMENTO DE PAREDES COM ERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57) M, EXCLUSIVE CHAPISCO, EMBOCO, NATA DE JUNTAMENTO OU ARGAMASSA COLANTE E JUNTAMENTO	Emboço 1º pavimento		
SGOTO/RALO SIFONADO DE PVC(100X100) 50MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM T AMPA EGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 3MM, INCLUSIVE LI GACAO DE 50MM DE PVC ATE A AIXA DE INSPECAO CONSIDERANDO A DISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Esgoto 1º pavimento		
SQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU ADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS/VIDRO EMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESURA, PARA PORTAS OU JANELAS FIXAS, EXCLUSIVE FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO	Fechamento de caixas e portas auxiliares 2º pavimento		
LETIRACABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO, LITIMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 3MM2, FORNECIMENTO E COLOCACAO	Infraestrutura da iluminação 3º pavimento		
SGOTO/RALO SIFONADO DE PVC(100X100) 50MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM T AMPA EGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 3MM, INCLUSIVE LI GACAO DE 50MM DE PVC ATE A AIXA DE INSPECAO CONSIDERANDO A DISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Esgoto 2º pavimento		
SGOTO/RALO SIFONADO DE PVC(100X100) 50MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM T AMPA EGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 3MM, INCLUSIVE LI GACAO DE 50MM DE PVC ATE A AIXA DE INSPECAO CONSIDERANDO A DISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Esgoto 3º pavimento		
ERVICOES COMPLEMENTARES/ SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO/	Pictação da parede para aplicação de barita		
	Limpeza da coluna de ar condicionado térreo		

Relatório Diário de Obra

RANSORTES/Retirada de entulho de obra em camba de aço com 5m3 de capacidade, inclusive irregamento do container, transporte e descarga, inclusive tarifa de disposicao final (desonerado)	Retirada de entulho	
ESTRUTURA DE PAREDES, TETOS E ISOS/REVESTIMENTO DE PAREDES COM ERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57) M, EXCLUSIVE CHAPISCO, EMBOCO, NATA DE JUNTAMENTO OU ARGAMASSA COLANTE E JUNTAMENTO	Emboço banheiro térreo	
LETIRACABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM LETRODUTOS NA BITOLA DE 2 - 5MM2, 30/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	Infraestrutura elétrica térreo	
SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO/DUTO PARA CONDIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM HAPA DE ACO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS ITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM OLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO INTAS, FITAS, SUPORTES PINTADOS, DIFUSORES E RELHAS EM ALU	Dutos ar condicionado 2º pavimento	
SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO/DUTO PARA CONDIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM HAPA DE ACO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS ITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM OLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO INTAS, FITAS, SUPORTES PINTADOS, DIFUSORES E RELHAS EM ALU	Dutos ar condicionado 3º pavimento	

Ocorrências

Imagens
  

Relatório Diário de Obra


WhatsApp Image 2022-11-01 at 08.43.59 (1).jpeg

Equipe envolvida			
Nome	Função	Quantidade	Expediente
	Engenheiro Civil	1,0000	12:00-17:00 -
	Pedreiro	3,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Comprador	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Técnico de Segurança	1,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Auxiliar Administrativo	2,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Eletricista	8,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Ajudante	31,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Bombeiro Hidráulico	7,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Encarregado de Obras	2,0000	07:00-12:00 13:00-17:00
	Vigia	1,0000	19:00-00:00 01:00-07:00

Ocorreu ainda a apresentação do novo layout de salas pela SMS, o que gerou algumas dúvidas descritas no relatório abaixo, os apontamentos do relatório serão discutidos com a SMS individualmente:

Relatório Técnico

Em atenção à nova planta apresentada para o Centro Carioca de Diagnóstico em 25/10/2022 pela Secretária Municipal de Saúde, fazemos as seguintes observações:

Pavimento Térreo:

Para as áreas de Medicina Nuclear em vidro devem ter atenção devido à blindagem necessária para as salas;

Pontuamos também que a sala de emergência não tem ligação direta com as salas de TC e RM. Caso tenhamos alguma intercorrência com pacientes durante sedação ou reação ao contraste, os pacientes deverão passar pela recepção principal para ter acesso à sala de emergência;

A área destinada a TI, não tem espaço físico suficiente para comportar toda a equipe e os servidores.

Primeiro Pavimento:

Reforçamos que a área destinada à Administração não é suficiente para toda a equipe administrativa.

Segundo Pavimento:

Foram reduzidos 03 (três) salas de ultrassom intervencionista e 02 (duas) salas de ultrassom geral. Será necessário redimensionar equipe e quantidade de exames por sala. Será alterado a quantidade de exames?

Terceiro Pavimento:

CME – Necessário possuir banheiro masculino e feminino e necessário ter uma sala para a coordenação da CME;

Área de lavagem de endoscópio não tem ligação com a CME;

Posto de enfermagem não tem visão de 06 (seis) leitos – 03 (três) femininos e 03 (três) masculinos que ficam na parte de trás do posto;

Redução de 01 (um) sala de endoscopia. Será necessário redimensionar equipe e quantidade de exames por sala. Será alterado a quantidade de exames?

Rio de Janeiro 27/10/2022

— LGPD 13.709/2018 —

Engenheira Clínica

Recursos humanos

Foi dado prosseguimento ao processo de recrutamento e seleção dos auxiliares administrativos, recepcionistas, técnicos em radiologia e maqueiros para atuar no Hospital Souza Aguiar e demais unidades avançadas tipo I, II e III. Além de 10 atendentes de consultório para atuar nas salas de ultrassonografia do CCD.

Foram avaliados 912 candidatos entre enfermeiros e técnicos de enfermagem que constavam no banco de talentos do Instituto para participar do processo seletivo, destes, foram selecionados 90 candidatos que irão seguir para a próxima etapa. As divulgações permanecem ocorrendo no site do Instituto e na página oficial no Instagram.



INSTITUTO GNOSIS

PROCESSO SELETIVO

CENTRO DE DIAGNÓSTICO CARIOCA

Vaga para Banco de Talentos

>>> FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO
 >>> ENFERMEIRO
 >>> TÉCNICO DE ENFERMAGEM
 >>> TÉCNICO DE RADIOLOGIA

Para concorrer a vaga, preencha o formulário de inscrição no nosso Banco de Talentos:
<https://www.institutognosis.org.br/banco-de-talentos>
 ou aponte sua câmera para o QR Code.

>>> FARMACÊUTICO
 >>> TÉCNICO DE FARMÁCIA

Para concorrer a vaga, preencha o formulário de inscrição no nosso Banco de Talentos:
<https://www.institutognosis.org.br/banco-de-talentos>
 ou aponte sua câmera para o QR Code.

>>> MÉDICO PNEUMOLOGISTA
 >>> MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
 >>> MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
 >>> MÉDICO CARDIOLOGISTA
 >>> MÉDICO EM ENDOSCOPIA
 >>> MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
 >>> MÉDICO GINECOLOGISTA
 >>> MÉDICO NEUROLOGISTA
 >>> MÉDICO NUCLEAR
 >>> MÉDICO PEDIATRA

Para concorrer a vaga, preencha o formulário de inscrição no nosso Banco de Talentos:
<https://www.institutognosis.org.br/banco-de-talentos>
 ou aponte sua câmera para o QR Code.


>>> AGENTE DE REGULAÇÃO / FATURAMENTO
 >>> PROGRAMADOR DE SISTEMAS
 >>> ANALISTA DE OUVIDORIA
 >>> ANALISTA DE SISTEMAS
 >>> TÉCNICO DE INFORMÁTICA
 >>> AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 >>> RECEPCIONISTA
 >>> MAQUEIRO

Para concorrer a vaga, preencha o formulário de inscrição no nosso Banco de Talentos:
<https://www.institutognosis.org.br/banco-de-talentos>
 ou aponte sua câmera para o QR Code.

Para mais informações acesse:
 @institutognosis
 @institutognosis
 @institutognosis

INCLUI
Banco de Talentos


Vaga também
aberta para PCD.

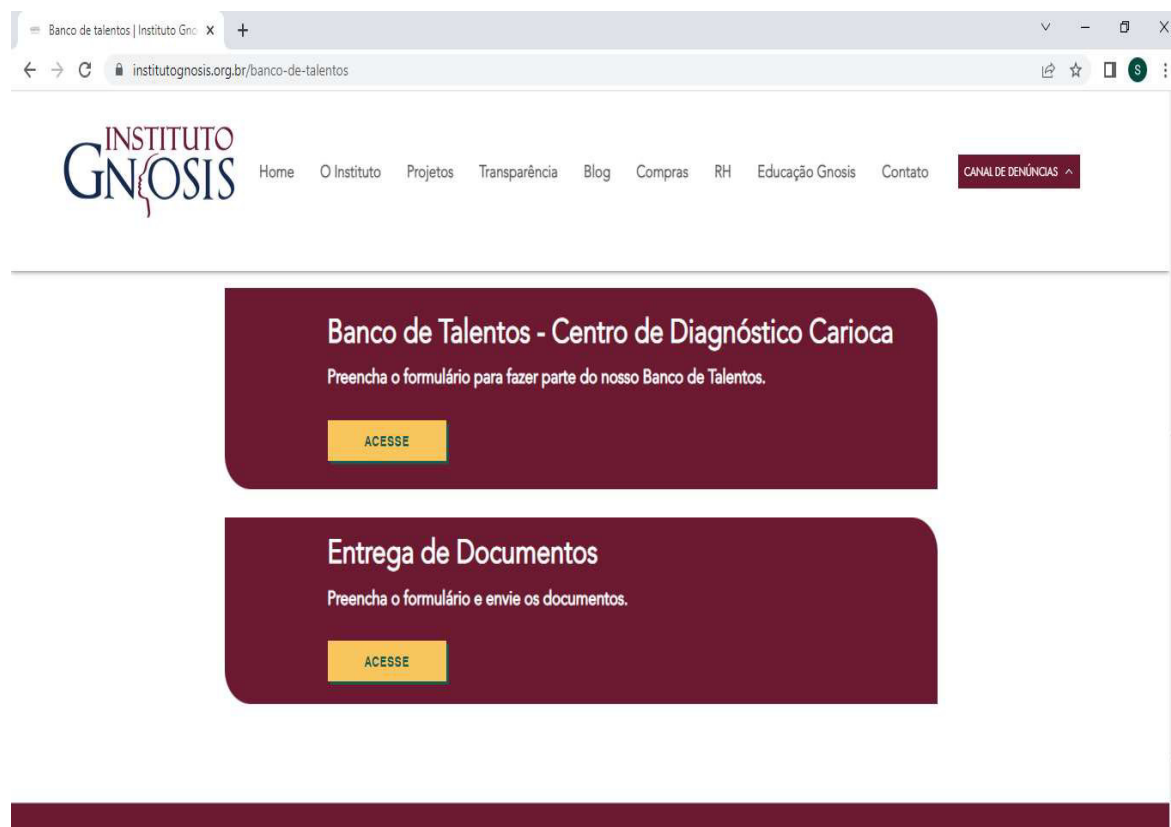


Foi realizada Integração dos novos colaboradores no Auditório da CADEG, além de treinamentos sobre Ergonomia. Tivemos também a participação pela equipe de Enfermagem e Farmacêutica no II Simpósio de Meios de Contraste e Segurança em Radiologia do Hospital Moinhos de Vento, com ênfase na escassez de Contrastes Radiológicos e otimização do uso de Contrastes Iodados e Gadolínio, acesso venoso e extravasamento de Contrastes Radiológicos, estratégias para tratamento e seguimento para pacientes que apresentam eventos adversos agudos aos meios de Contrastes.

O ponto biométrico da sede já foi comprado e aguarda homologação do órgão competente para instalação. Visto que haverá profissionais lotados nas unidades avançadas, foi observada a necessidade de aquisição de um relógio de ponto para cada uma dessas unidades.

Ocorreu ainda a apresentação da Implantação do Serviço de Tele radiologia para o Secretário de Saúde Drº Daniel Soranz, no auditório do Complexo Regulador no Hospital Municipal Souza Aguiar. O tele laudo de forma geral, tem principal objetivo proporcionar a realização de laudos rápidos e especializados à distância. Sendo assim, ele é importante para visualização e resultados em menor tempo, trazendo mais agilidade no tratamento do paciente, onde no mesmo dia pode levar o seu laudo para o médico avaliar.

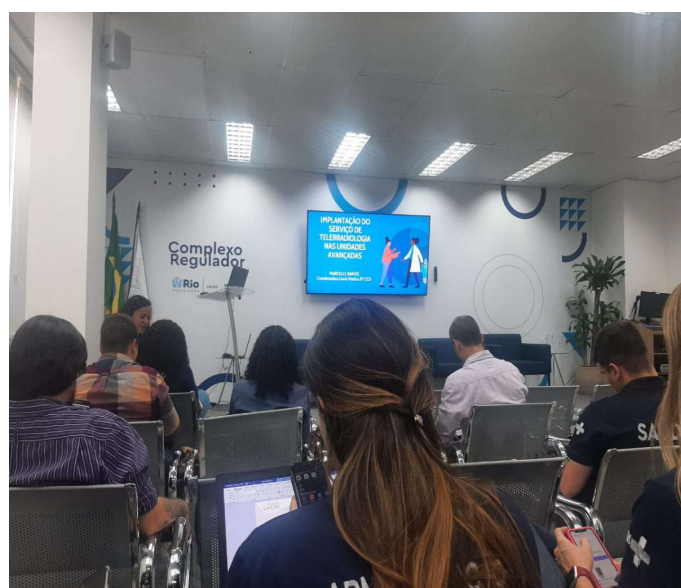

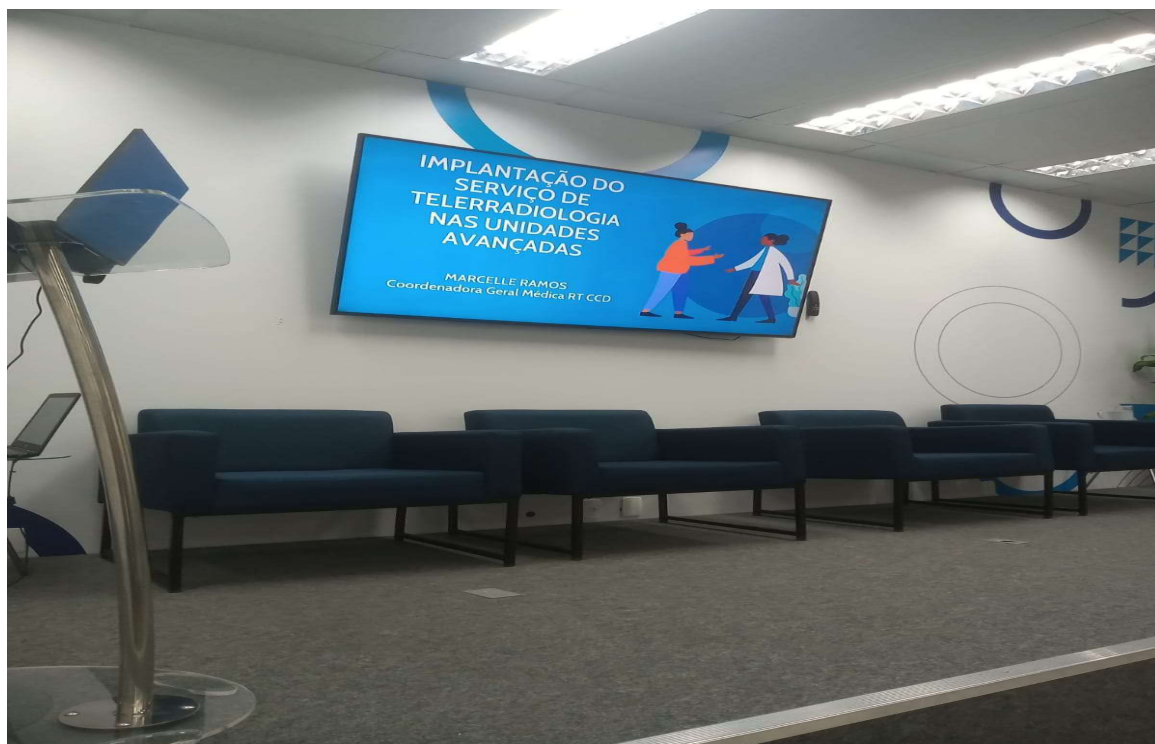

Em cumprimento a decisão da SMS, ocorreu o remanejamento de todos os colaboradores contratados para atuar no CCD para as unidades avançadas, visto que não há ainda previsão de inauguração, podemos observar a nova lotação dos profissionais na tabela abaixo:

VANÇADA	UNIDADE	PROFISSIONAIS	FUNCAO
TIPO I	CENTRO DE IMAGEM ROCINHA	LGPD 13.709/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
			TECNICO RADIOLOGIA
	CF ADIB JATENE	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	CF HARVEY RIBEIRO	LGPD 13.709/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
			TECNICO RADIOLOGIA
	CF OTTO ALVES	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	CMS BELIZARIO	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	POLICLINICA LINCOLN	LGPD 13.709/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
			TECNICO RADIOLOGIA
	CMS MANOEL GUILHERME	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TIPO II	POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	H M FRANCISCO DA SILVA TELLES	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	H M JESUS	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	H M PIEDADE	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	H M ROCHA FARIA	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	RONALDO GAZOLLA	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	UPA CIDADE DE DEUS	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TIPO III	UPA MADUREIRA	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	LOURENÇO JORGE	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	MIGUEL COUTO	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	SALGADO FILHO	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	SOUZA AGUIAR	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
		LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
		LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	APOIO T.I.	LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
		LGPD 13.709/2018	TECNICO RADIOLOGIA
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Após a realocação dos profissionais contratado em todas as unidades avançadas, foi elaborada apresentação do cenário encontrado em cada uma delas pela ótica desses colaboradores e apresentado a SMS, contemplando as seguintes informações:

- CNES:
- Total de leitos:
- Qual o número de atendimentos dia/mês:
- Qual o número de tomografias por dia:
- Qual o número de raio-X por dia:
- Há agenda no SISREG?
- Existe restrição de exame?
- Qual o tempo de liberação do laudo:
- Qual o fluxo da solicitação do exame:
- Qual o tempo médio entre a chegada à realização do exame:
- Existe serviço de endoscopia?
- Existe serviço de colonoscopia?
- Existe serviço de broncoscopia?
- Existe serviço de Ultrassonografia?

2.2 Equipamentos

Considerando a instalação dos aparelhos de ressonância magnética, a construtora realizou a contratação da gaiola de faraday (Blindagem de RF) e chiller dedicado aos aparelhos de ressonância magnética. Essa blindagem garante o isolamento de RF das frequências exigidas pelos fabricantes, evitando assim interferências externas que podem gerar problemas na aquisição de imagens.

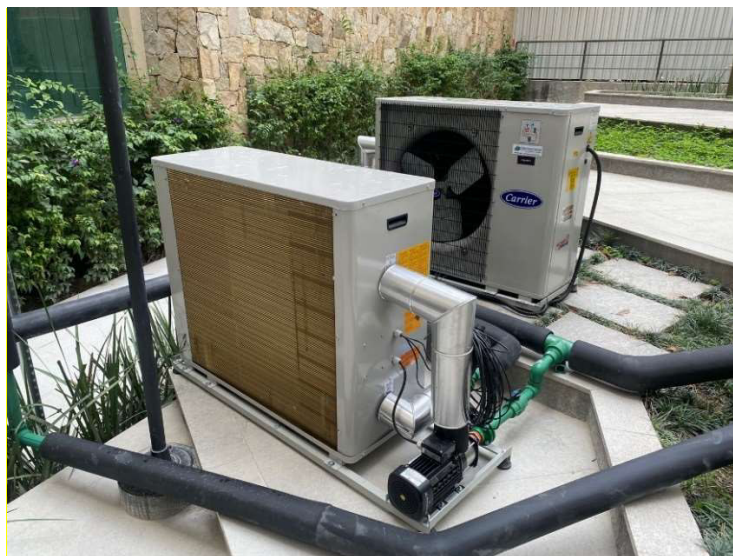


Figura 1- Chiller RM

Foram recebidos 02 (dois) equipamentos de Broncoscopia, 04 (quatro) de Endoscopia Digestiva e 04 (quatro) de Colonoscopia para compor o parque tecnológico.



Figura 2- Equip. de vídeo

Conforme normativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), se faz necessário a autorização do órgão para construção do setor de medicina nuclear no CCD. Sendo assim, ficou estabelecido que o físico contratado pelo Instituto deverá proceder com o cadastro junto ao órgão. Além disso, foi fornecida listagem dos

equipamentos de tomografia e aparelhos de raio x das unidades avançadas e CCD para regularização junto ao Laboratório de Ciências Radiológicas (LCR).


Visando o início das atividades no Centro Carioca de Diagnóstico - CCD, foi finalizado o projeto para a instalação do equipamento NM 830. O projeto foi repassado à empreiteira para finalização da obra da sala de cintilografia.



Figura 3: Projeto NM 830

Deu-se início a realização de estudo técnico preliminar para a elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa de manutenção regular, incluindo preventivas e corretivas com troca de peças para os equipamentos do CCD após o fim da garantia. Foi realizado também o alinhamento com a empresa Philips para que a entrega dos aparelhos de ultrassom seja realizada na segunda quinzena de novembro/2022. Essa alteração foi necessária, devido à ausência de espaço para receber os equipamentos no CCD.

Ocorreu também em conjunto com a equipe assistencial o alinhamento de que as biópsias realizadas nos mamógrafos, irão ocorrer com os pacientes sentados em cadeiras e não em mesa de exame, essa definição foi extremamente importante, pois impactaria diretamente no layout da sala de exames. Segue abaixo o estudo preliminar do mamógrafo.

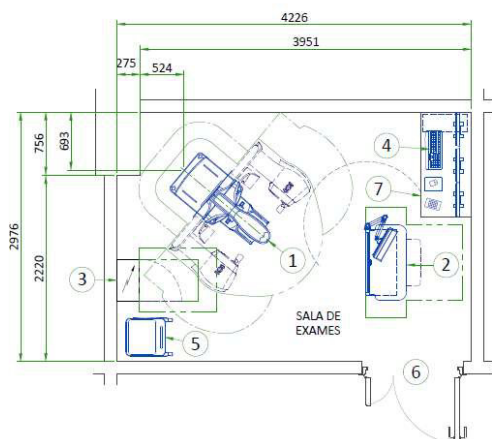

Altura da Sala de Exames	
Altura do Piso Acabado até o Forro	2.70m
Instituto Gnosis Rio De Janeiro, RJ BRASIL	
 GE Healthcare	
Marcelo Paulino +55 31 99938 6597 Marcelo.paulino@ge.com	
SENOGRAPHE PRISTINA ESTUDO PRELIMINAR	

Figura 4- Estudo Preliminar Mamógrafo

Foi realizada pela equipe de engenharia clínica a cotação de frete para a entrega dos aparelhos de densitometria, orçamento aguarda aprovação do setor financeiro. Além da disponibilização para a construtora das especificações do equipamento de ultrassom para conclusão da obra nas salas destinadas ao exame.

Manutenção dos equipamentos das Unidades Avançadas

- **POLICLINICA RODOLPHO ROCCO**

Realizado reparo no tomógrafo que se encontrava inoperante, o mesmo apresentava erro na reconstrução da imagem.

- **POLICLINICA LINCON DE FREITAS**

1. Realizada calibração do equipamento que operava parcialmente devido a artefatos circulares na imagem.

- **H.M SOUZA AGUIAR**

1. Realizada reinstalação do software no tomógrafo GE que não inicializava e encontrava-se inoperante.
2. Realizada manutenção do aparelho de raio x que encontrava-se com tampo da mesa solto.
3. Foi solicitado a GE orçamento para manutenção corretiva dos equipamentos de raio x das salas 1 e 2 que se encontram inoperantes, permanecemos aguardando a visita.
4. Foram habilitados para envio dos exames para a rede os equipamentos de tomografia, raio x digital e dary, visando a instalação da telerradiologia.

- **H. M. Jesus**

1. Foi aberto chamado junto à empresa Canon, pois o tomógrafo atualmente vem operando com restrições, os exames não estão migrando para o sistema Vítrea. A unidade recebeu visita da equipe técnica, que constatou a necessidade de retorno do engenheiro clínico da empresa, visita prevista para 03/11.

- **CENTRO DIAGNÓSTICO ROCINHA**

1. Foi aberto chamado junto a empresa Neusoft, pois o tomógrafo encontra-se inoperante, apresentando falha na conexão à reconstrução. A visita está prevista para o dia 03/11.

2.3 Sistemas de Informação

- **PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente)**

Após ter passado pelo processo de licitação, a empresa MV Informática foi contratada para prover o sistema de Prontuário Eletrônico, RIS e PACS, um dos mais modernos

do mercado com todas as funcionalidades para a geração de todo conteúdo com o conceito de nuvem e servidores internos e irá gerar terabytes de imagens e informações dos usuários para todos os laudos necessários.

Dando prosseguimento a instalação do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) e Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde, foram discutidos e analisados a fim do cumprimento das necessidades dos usuários e requisitos do Termo de Colaboração, como a geração de informação necessária para o acompanhamento dos indicadores especificados no Contrato de Gestão, tais como: cadastro básico e identificação do paciente, dispensação de material e medicamentos, fluxo de entrega de laudos, regulação de exames e faturamento, fluxo de reagendamentos de exames, interface com o SISREG, entre outros. Foi disponibilizado para a contratada, o arquivo XML da base CNES, para elaboração de ambiente teste do sistema, para posterior validação das áreas técnicas afins.

O planejamento para utilização das pesquisas de satisfação através de totem e para uso de senhas para os usuários está em curso. Todos os ramais serão digitais e interligados para o total conceito de informação com os colaboradores.

- **CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde)**

A partir inserção do CCD no CNES, foi possível efetuar o cadastro dos profissionais contratados, bem como os equipamentos que irão compor a infraestrutura do estabelecimento.

- **FPO (Ficha de Programação Orçamentária)**

Está sendo finalizada a carteira de procedimentos ofertados no CCD, com seus respectivos códigos SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM – Órteses, próteses e materiais especiais do SUS), para que possamos maximizar o faturamento da instituição.

- **Unidades Avançadas**

Foi realizado levantamento do total de exames de imagem no período compreendido entre os meses de set/21 a set/22 através da plataforma TABNET, com intuito de avaliar a produção das unidades avançadas anteriores a gestão do Instituto Gnosis e com isso atuar tanto na otimização das agendas, quanto nas inconsistências passíveis de ajustes.

Seguem abaixo as tabelas com as produções por unidade:

Centro de Imagem Rocinha

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ														
Qtd.Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento														
Estabel-CNES-RJ: 0215015 SMS CENTRO DE IMAGEM ROCINHA														
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista														
Período: Set/2021-Set/2022														
PROCEDIMENTO	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRA	1	10	7	11	3	3	7	7	4	14	12	15	23	117
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CC	4	16	18	20	21	17	15	25	21	48	29	39	25	298
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRA	0	4	4	4	3	1	2	4	1	7	8	6	4	48
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULAC	18	26	31	26	21	14	27	23	28	42	27	40	46	369
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0206010060 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	21	26	27	42	20	39	16	42	37	51	37	33	39	430
0206010087 TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZADA	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPER	0	3	1	4	3	2	1	1	2	8	1	7	2	35
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRA	0	3	12	1	7	0	15	14	5	0	2	0	17	76
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	64	73	94	92	61	74	113	113	101	123	102	104	100	1214
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	30	28	27	30	22	27	31	23	30	45	48	43	39	423
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIO	3	2	2	8	1	3	0	1	4	7	9	13	0	53
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve / Bacia / ABDOMEN INFERIO	34	40	33	37	25	25	30	26	31	50	45	50	43	469
total	177	233	258	279	191	205	257	279	264	395	320	350	338	3546

Harvey Ribeiro De Souza Filho

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ														
Qtd.Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento														
Estabel-CNES-RJ: 2708213 SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO - AP														
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista														
Período: Set/2021-Set/2022														
PROCEDIMENTO	jul/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22 Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/	1	2	2	2	3	5	2	7	6	2	9	8	0	59
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ (	8	5	11	7	7	10	7	11	3	11	6	12	0	106
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/	0	2	4	2	1	2	0	1	2	4	4	5	0	29
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ART	3	3	2	8	5	4	3	7	4	4	4	5	0	57
0206010060 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	16	15	11	15	14	14	10	16	9	14	12	21	0	178
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBR	4	0	2	0	1	0	2	0	0	0	4	3	0	16
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARI	1	0	0	3	0	3	0	9	4	12	0	0	0	34
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	21	22	29	25	18	22	33	48	32	45	54	58	0	447
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	15	14	21	12	19	14	18	19	7	17	16	18	0	203
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBR	0	4	3	1	1	4	3	3	0	0	10	8	0	37
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve / Bacia / ABDOMEN	17	17	24	21	23	14	16	20	8	19	16	26	0	235
Total	86	84	109	96	92	92	94	141	75	130	135	164	0	1403

Otto Alves de Carvalho

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ													
Qtd.Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento													
Estabel-CNES-RJ: 6927289 SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO - AP 40													
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista													
Período: Set/2021-Set/2022													
PROCEDIMENTO	set/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/	10	5	3	4	4	4	2	3	0	0	0	0	35
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ C	12	8	11	9	11	5	9	7	0	0	0	0	72
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/	6	1	0	2	0	2	3	0	0	0	0	0	14
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ART	7	6	7	3	5	5	4	3	0	0	0	0	40
0206010060 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	15	16	15	13	16	18	12	7	0	0	0	0	112
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRC	2	0	12	0	1	2	0	0	0	0	0	0	17
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARI	0	6	0	3	2	7	15	6	0	0	0	0	39
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	64	26	28	30	32	45	31	22	0	0	0	0	278
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	13	15	15	15	16	25	12	8	0	0	0	0	119
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRC	3	2	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	22
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN I	20	13	19	14	14	21	20	14	0	0	0	0	135
Total	152	98	115	99	107	134	109	70	0	0	0	0	884

Policlínica Lincoln de Freitas Filho

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ														
Qtd.Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento														
Estabel-CNES-RJ: 2280191 SMS POLIC LINCOLN DE FREITAS FILHO - AP 53														
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista														
Período:Set/2021-Set/2022														
PROCEDIMENTO	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	1	5	10	4	4	0	7	4	7	20	10	10	7	89
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE	9	13	12	6	8	0	15	10	15	22	12	8	19	149
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE	3	1	5	7	1	0	5	1	5	12	9	5	5	59
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-	4	10	16	12	12	0	10	7	10	20	15	10	7	133
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	27	16	30	28	14	1	19	22	32	38	38	31	36	332
0206010087 TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZADA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR	1	3	5	4	0	0	3	5	3	4	8	5	7	48
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRA)	4	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	35	60	65	62	37	3	17	44	51	104	84	74	50	686
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	18	27	40	33	22	1	17	33	36	42	36	36	20	361
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	1	5	7	9	5	0	8	13	4	12	11	12	6	93
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR	25	26	42	39	23	2	20	33	37	50	40	45	33	415
Total	128	169	233	205	126	7	122	173	200	324	263	236	190	2376

CMS Manoel Guilherme da Silveira Filho

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ												
Qtd.Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento												
Estabel-CNES-RJ: 6922031 SMS CMS MANOEL G DA SILVEIRA FILHO AP 51												
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista												
Período:Set/2021-Set/2022												
PROCEDIMENTO	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/	0	9	3	0	5	12	10	10	10	10	16	75
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/	4	19	6	0	22	11	18	11	27	20	20	138
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/	1	1	2	0	1	7	5	4	9	9	9	39
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ART	2	16	4	0	15	20	11	17	12	21	21	118
0206010060 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	5
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	1	16	7	0	30	21	20	23	27	28	28	173
0206010087 TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	7	23	2	0	19	23	25	19	37	27	27	182
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	1	7	4	0	11	15	12	16	16	13	13	95
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN I	1	10	6	0	17	21	17	21	20	21	13	134
Total	17	102	35	0	120	130	119	124	160	155	962	

Hospital Municipal Francisco Silva Telles

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ														
Qtd.Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento														
Estabel-CNES-RJ: 2291266 SMS HOSP MUN FRANCISCO DA S TELLES														
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista														
Período: Set/2021-Set/2022														
PROCEDIMENTO	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	6	5	2	1	10	0	0	0	0	0	0	0	1	25
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE	34	9	7	2	3	0	1	2	6	4	2	5	5	80
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-M	6	8	4	0	2	0	0	1	1	4	1	5	5	37
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	99	99	122	74	37	2	34	188	134	115	37	84	153	1178
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRACC	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	249	291	173	104	97	0	40	104	74	62	2	45	82	1323
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	17	24	15	6	0	0	17	89	80	69	0	59	99	475
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR	30	66	42	43	2	0	7	0	0	0	0	0	0	190
Total	447	507	366	232	151	2	100	384	295	254	42	198	345	3323

Hospital Municipal Jesus

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ														
Qtd.Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento														
Estabel-CNES-RJ: 2269341 SMS HOSP MUN JESUS														
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista														
Período: Set/2021-Set/2022														
PROCEDIMENTO	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA I	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / AI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	5
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	0	0	0	1	0	3	0	2	0	2	0	2	0	10
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	0	0	21	35	53	42	16	64	48	36	1	58	54	428
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEME	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	0	0	2	5	7	9	3	9	12	10	0	11	13	81
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	0	0	4	2	3	9	0	6	3	3	0	4	4	38
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDO	0	0	1	2	2	6	0	1	3	2	0	2	3	22
Total	0	0	29	46	65	69	19	82	68	53	1	82	75	589

Hospital Municipal da Piedade

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ														
Qtd.Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento														
Estabel-CNES-RJ: 2269481 SMS HOSP MUN DA PIEDADE														
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista														
Período: Set/2021-Set/2022														
PROCEDIMENTO	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	2	1	1	10
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C,	2	3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	4	3	27
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU	1	1	0	2	0	1	1	2	1	0	1	1	1	12
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / AR	0	2	2	4	1	1	2	2	4	1	2	3	3	27
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	6
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	12	7	7	12	2	10	8	9	34	34	28	34	25	222
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMB	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	6
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULA	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	2	0	1	8
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	10	5	18	21	4	17	7	11	20	15	14	17	16	175
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	32	36	23	47	18	47	13	38	38	38	45	55	42	472
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMB	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	7
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN	24	25	27	40	13	43	11	36	37	36	46	57	43	438
Total	81	80	82	130	40	125	44	105	140	132	142	174	135	1410

Hospital Municipal Rocha Faria

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ Qtd. Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento Estabel-CNES-RJ: 2295407 SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA - AP 52 SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista Período: Set/2021-Set/2022														
PROCEDIMENTO	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	75	71	67	78	90	88	88	86	160	67	67	69	68	1074
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE	66	60	54	73	55	52	57	71	100	69	65	52	63	837
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE	37	13	20	37	26	23	25	34	46	27	23	19	25	355
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES	133	143	152	163	181	152	201	189	378	172	205	123	156	2360
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	17	13	11	15	17	21	18	11	26	18	33	11	11	222
0206010060 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCOICA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	675	724	661	718	736	678	845	779	1662	796	898	650	793	10615
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR	44	35	33	26	22	19	39	37	78	26	26	23	18	426
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRACO, MAO, COXA, PERNA, PE)	20	21	17	7	6	29	19	16	54	23	13	16	22	263
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	722	843	662	676	791	743	990	858	1828	874	987	658	646	11278
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	45	43	44	45	53	52	46	47	74	43	38	18	42	590
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR	735	855	671	690	810	744	1004	875	1844	862	1003	680	676	11449
Total	2569	2827	2392	2528	2788	2602	3332	3003	6250	2977	3359	2325	2520	39472

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ Qtd. Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento Estabel-CNES-RJ: 5717256 SMS HOSP MUN RONALDO GAZOLLA SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista Período: Set/2021-Set/2022														
PROCEDIMENTO	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	0	0	0	1	1	2	0	3	0	1	4	3	3	18
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE	1	2	1	1	2	1	0	1	2	39	10	3	4	67
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES	1	2	4	26	24	3	0	2	4	12	6	0	2	86
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	0	0	3	0	2	2	0	0	0	8	6	2	2	25
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	24	35	38	66	77	66	25	61	92	67	66	82	85	784
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRACO, MAO, COXA, PERNA, PE)	0	0	0	1	0	1	0	4	2	0	2	0	4	14
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	471	139	105	225	453	292	92	181	258	183	163	170	197	2929
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	17	15	20	32	40	67	24	39	88	63	63	56	72	596
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	0	0	3	0	0	2	0	0	6	1	2	0	4	18
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR	15	11	17	28	35	60	23	36	88	61	61	57	70	562
Total	529	204	192	380	634	496	164	329	540	435	385	373	444	5105

UPA 24H Madureira

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ Qtd. Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento Estabel-CNES-RJ: 6661904 SMS UPA 24H MADUREIRA - AP 33 SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista Período: Set/2021-Set/2022														
PROCEDIMENTO	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	0	0	0	10	0	0	0	0	2	1	1	0	0	14
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	0	0	0	12	0	0	0	0	2	3	1	1	0	19

Hospital Municipal Lourenço Jorge

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ															
Qtd. Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento															
Estabél-CNES-RJ: 2270609 SMS HOSP MUN LOURENCO JORGE															
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista															
Período: Set/2021-Set/2022															
PROCEDIMENTO	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	30	49	77	162	130	80	74	92	120	118	109	97	35	42	1215
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE	6	13	16	32	19	24	18	27	29	27	35	23	16	12	297
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE	2	11	14	12	6	16	8	16	12	13	6	10	4	7	137
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES	50	83	117	284	224	97	111	105	179	178	159	135	36	48	1806
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	0	3	2	1	0	1	1	3	3	0	3	4	2	2	25
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	92	387	414	1081	850	447	473	526	587	623	571	468	286	269	7074
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR	6	14	15	37	22	12	16	20	18	16	15	17	6	6	220
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRACO, MAO, COXA, PERNA,	4	9	7	11	14	8	19	17	14	17	10	15	8	5	158
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	78	314	268	704	538	313	267	276	316	312	337	274	149	156	4302
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	92	248	267	622	539	323	341	369	383	370	325	285	175	168	4507
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	4	12	4	17	16	12	15	18	17	19	19	15	8	6	182
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR	80	173	243	613	527	325	341	370	367	363	328	292	177	173	4372
Total	444	1316	1444	3576	2885	1658	1684	1839	2045	2056	1917	1635	902	894	24295

Hospital Municipal Miguel Couto

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/SUS-AB - MS/SMS-RJ														
Qtd. Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento														
Estabel-CNES-RJ: 2270269 SMS HOSP MUN MIGUEL COUTO														
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista														
Período: Set/2021-Set/2022														
PROCEDIMENTO	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	118	122	149	121	101	108	146	54	139	226	152	126	87	1649
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE	93	101	121	83	93	74	105	55	131	234	142	118	93	1443
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE	46	46	58	44	37	27	61	89	62	100	79	58	63	770
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES	65	41	80	62	78	70	78	84	99	162	129	125	92	1165
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO	0	1	2	1	2	3	2	6	1	12	10	8	4	52
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	474	429	526	485	516	471	550	503	581	1156	679	549	497	7416
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR	47	48	72	64	45	44	73	77	66	104	44	48	50	782
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	300	288	311	284	273	248	307	265	276	580	333	250	230	3945
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	306	300	338	323	281	330	458	397	394	859	442	383	306	5117
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	53	58	90	62	54	46	73	84	72	132	63	55	45	887
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve / Bacia / ABDOMEN INFERIOR	145	136	135	144	120	102	171	151	165	404	180	195	127	2175
Total	1647	1570	1882	1673	1600	1523	2024	1765	1986	3969	2253	1915	1594	25401

Hospital Municipal Salgado Filho

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/SUS-AB - MS/SMS-RJ																	
Qtd. Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento																	
Estabel-CNES-RJ: 2296306 SMS HOSP MUN SALGADO FILHO																	
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista																	
Período: Set/2021-Set/2022																	
PROCEDIMENTO	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	0	0	10	46	52	70	61	47	45	55	70	71	68	137	66	21	819
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE	0	0	12	28	60	57	32	40	29	22	46	61	53	100	57	24	621
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE	0	0	1	4	15	28	14	14	10	11	8	16	18	37	18	7	201
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES	0	0	19	88	98	108	112	81	73	117	126	116	155	265	118	36	1512
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO	0	0	1	9	8	8	11	6	4	9	6	12	10	4	12	3	103
0206010060 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	1	0	94	467	492	537	506	465	378	501	618	736	644	1228	567	229	7463
0206010087 TOMOMIOLOGRAFIA COMPUTADORIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR	0	0	5	9	5	17	7	1	9	5	5	23	16	26	20	1	149
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACÇO, ANTEBRA	0	0	0	2	1	0	0	3	3	8	12	0	0	15	5	0	49
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	0	1	65	334	325	401	343	331	231	278	273	375	356	625	291	94	4323
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	0	2	72	371	425	451	375	389	326	382	474	528	484	843	416	151	5689
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	0	0	3	17	23	16	11	20	16	21	40	31	30	33	17	6	284
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve / Bacia / ABDOMEN INFERIOR	0	1	47	242	311	323	281	272	221	241	277	350	336	576	310	114	3902
Total	1	4	329	1617	1815	2016	1753	1669	1346	1651	1955	2319	2170	3891	1898	686	25120

Hospital Municipal Souza Aguiar

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/SUS-AB - MS/SMS-RJ															
Qtd. Apresentada por PROCEDIMENTO e Mês Atendimento															
Estabel-CNES-RJ: 2280183 SMS HOSP MUN SOUZA AGUIAR															
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0205-Diagnóstico por ultra-sonografia, 0206-Diagnóstico por tomografia, 0207-Diagnóstico por ressonância magnética, 0210-Diagnóstico por radiologia intervencionista															
Período: Set/2021-Set/2022															
PROCEDIMENTO	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Total
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	234	0	0	185	184	233	187	124	132	137	125	94	79	66	1780
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE	83	0	0	36	90	114	111	78	70	74	56	50	44	52	918
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE	19	0	0	11	16	13	24	5	9	6	19	14	17	15	168
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES	140	0	0	130	176	225	191	116	157	139	151	126	109	104	1764
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO	32	0	0	15	28	41	43	27	28	27	35	30	29	25	360
0206010060 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	1064	0	0	839	1012	1045	1056	617	650	665	829	643	472	491	9383
0206010087 TOMOMIOLOGRAFIA COMPUTADORIZADA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR	59	0	0	45	64	52	33	18	29	21	31	32	18	19	421
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	1527	0	0	1200	1413	891	693	359	319	361	386	347	245	223	7964
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	1275	0	0	840	1105	1138	1140	749	858	839	855	782	518	583	10682
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	111	0	0	89	94	79	83	32	34	53	54	34	13	21	697
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve / Bacia / ABDOMEN INFERIOR	1273	0	0	810	1048	1090	1073	719	782	793	827	770	502	572	10259
Total	5817	0	0	4261	5230	4921	4635	2844	3068	3115	3369	2922	2046	2171	44399

2.4 Implantação do telelaudo nas Unidades Avançadas

As informações apresentadas abaixo, foram colhidas em visitas e estão relacionadas a manutenção dos tomógrafos, Raio-x Konica e Minolta, padronização da identidade visual, adequações na estrutura física, aquisição de computadores, impressoras, mobiliário e insumos, gestão das agendas do SISREG pela equipe de reguladores do CCD, contratação de recursos humanos para recepção, técnicos em radiologia para operação dos tomógrafos, supervisores administrativos em unidades estratégicas indicadas pela SMS e maqueiros (Avançadas tipo III) e implantação de Telelaudo. Participaram dessas visitas: Lidia Moreira (Coordenador Regulação/ Faturamento e Gisele Eloy (Coordenador Administrativo) e Taisa Matias (Agente de Regulação).

Segue abaixo o quadro de pessoal que foi estabelecido para cada uma das unidades avançadas de acordo com a sua classificação (Tipo I, II e III):

AVANÇADAS	UNIDADE	Auxiliar administrativo (diarista 08h as 17h)	Auxiliar administrativo (escala 12 x 36) SD	Auxiliar administrativo (escala 12 x 36) SN	Técnico em radiologia (diarista 08h as 17h)	Técnico em radiologia (escala 2 x de 12h) SD	Técnico em radiologia (escala 2 x de 12h semanal SD e SN)	Maqueiro
TIPO I	CENTRO DE IMAGEM ROCINHA	1	0	0	2	0	0	0
	CF ADIB JATENE	1	0	0	2	0	0	0
	CF HARVEY RIBEIRO	1	0	0	2	0	0	0
	CF OTTO ALVES	1	0	0	2	0	0	0
	CMS BELIZARIO PENNA	1	0	0	2	0	0	0
	POLICLINICA LINCOLN	1	0	0	2	0	0	0
	CMS MANOEL GUILHERME	1	0	0	2	0	0	0
	POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	1	0	0	2	0	0	0
	TOTAL	8	0	0	16	0	0	0
TIPO II	H M FRANCISCO DA SILVA TELLES	0	2	0	0	3	0	0
	H M JESUS	0	2	0	0	2	0	0
	H M PIEDADE	0	2	0	0	3	0	0
	H M ROCHA FARIA	0	2	0	0	3	0	0
	RONALDO GAZOLLA	0	2	0	0	2	0	0
	UPA CIDADE DE DEUS	0	2	0	0	2	0	0
	UPA MADUREIRA	0	2	0	0	3	0	0
	TOTAL	0	14	0	0	18	0	0
TIPO III	H M LOURENÇO JORGE	0	2	2	0	0	7	4
	H M MIGUEL COUTO	0	2	2	0	0	7	4
	H M SALGADO FILHO	0	2	2	0	0	7	4
	H M SOUZA AGUIAR	0	2	2	0	0	7	4
	TOTAL	0	8	8	0	0	28	16

1. UNIDADE: POLICLINICA RODOLPHO ROCCO – A.P 3.2

Data da visita: 18/10

Responsável pela unidade: Leandro Costa

Horário de funcionamento do centro de imagem: 08h às 17h

Agenda SISREG: Aberta

Identidade visual: Previsão 16/12

Gerador: Não possui

RH contratado: 2 técnicos em radiologia e 1 recepcionista

Telelaudo implantado: Sim

Observação: O aparelho de RX encontra-se em uso dentro da Policlínica e não no Centro de imagem

Segue abaixo a agenda de exames que foram disponibilizados no SISREG:

SEGUNDA TC 1	TERÇA TC 1	QUARTA TC 1	QUINTA TC 1	SEXTA TC 1
08:00 AS 08:20	08:00 AS 08:21	08:00 AS 08:22	08:00 AS 08:23	08:00 AS 08:24
MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1
08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40
MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1
08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00
SELA TURCICA	SELA TURCICA	SELA TURCICA	SELA TURCICA	SELA TURCICA
09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20
MASTOIDE 1	MASTOIDE 1	MASTOIDE 1	MASTOIDE 1	MASTOIDE 1
09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40
ORBITA 1	ORBITA 1	ORBITA 1	ORBITA 1	ORBITA 1
09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00
APARELHO URINARIO 2	APARELHO URINARIO	APARELHO URINARIO	APARELHO URINARIO	APARELHO URINARIO
10:00 AS 12:00 6	10:00 AS 11:40	10:00 AS 11:40	10:00 AS 11:40	10:00 AS 11:40
PELVE (QUADRIL)	PELVE (QUADRIL)	PELVE (QUADRIL)	PELVE (QUADRIL)	PELVE (QUADRIL)
ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20
MASTOIDE	MASTOIDE	MASTOIDE	MASTOIDE	MASTOIDE
13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40
FACE	FACE	FACE	FACE	FACE
13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00
COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL
14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20
COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA
14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40
COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR
14:40 AS 15:00	14:40 AS 15:40	14:40 AS 15:40	14:40 AS 15:40	14:40 AS 15:40
FACE	FACE	FACE	FACE	FACE
15:00 AS 16:20	15:00 AS 16:20	15:00 AS 16:20	15:00 AS 16:20	15:00 AS 16:20
CRANIO	CRANIO	CRANIO	CRANIO	CRANIO
16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00
TORAX	TORAX	TORAX	TORAX	TORAX

Total de exames laudados no período.

Exame	Quantidade de Exames
TC ANGIOTOMOGRAFIA	1
TC Abdome	25
TC Coluna Cervical	4
TC Coluna Dorsal	2
TC Coluna Lombar	19
TC Cranio	19
TC Face	3
TC Femur Direito	1
TC Femur Esquerdo	1
TC Joelho Direito	1
TC Joelho Esquerdo	1
TC Mastóides (ouvidos)	1
TC Pelve	41
TC Torax	17
Total	136

2. UNIDADE: POLICLINICA LINCON DE FREITAS – A.P 5.3

Data da visita: 18/10

Responsável pela unidade: Níria

LGPD 13.709/2018

Horário de funcionamento do centro de imagem: 08h às 17h

Agenda SISREG: Aberta até dezembro com exames na parte da tarde

Identidade visual: Previsão 16/12

Gerador: Não possui

RH contratado: 2 técnicos em radiologia e 1 recepcionista

Telelaudo implantado: Sim

Total de exames laudados no período:

Nome	Quantidade
ABDOME	13
ABDOME SUPERIOR	2
CERVICAL	5
COLUNA DORSAL	1
COLUNA LOMBAR	26
COLUNA TORACICA	2
FACE	3
JOELHO D	1
JOELHO E	1
MASTOIDES	1
OMBRO DIR	1
OMBRO ESQ	1
PELVE	20
PESCOCO	1
RECON PARENQUIMA	1
RECON PM	2
SEIO DA FACE	3
TC ABDOME	20
TC ABDOME SUPERIOR	5
TC ABDOME TOTAL	4
TC ABDOME+PELVE	3
TC BACIA	1
TC C TORACICA	1
TC COL TORACICA	1
TC COLUNA CERVICAL	4
TC COLUNA DORSAL	1
TC COLUNA LOMBAR	16
TC COLUNA LOMBO-SACRA	3
TC CRANIO	35
TC FACE	1
TC MASTOIDES	1
TC MMII ESQ	1
TC MMII JOELHO L D	3
TC MMII JOELHO L E	2
TC OMBRO	1
TC PELVE	33
TC PUNHO	1
TC SEIOS DA FACE	1
TC TORAX	42

Total
264

3. UNIDADE: UPA MADUREIRA – A.P 3.3

Data da visita: 14/10

Responsável pela unidade: Moisés LGPLD 13.709/2018

Horário de funcionamento do centro de imagem: 07h às 19h

Agenda SISREG: Sim

Identidade visual: Previsão 16/12

Gerador: Não possui

RH contratado: 3 técnicos em radiologia e 2 recepcionistas

Telelaudo implantado: Sim

Segue abaixo a agenda SISREG:

SEGUNDA TC 1	TERÇA TC 1	QUARTA TC 1	QUINTA TC 1	SEXTA TC 1
08:00 AS 08:20	08:00 AS 08:21	08:00 AS 08:22	08:00 AS 08:23	08:00 AS 08:24
MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1
08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40
MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1
08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00
SELA TURCICA	SELA TURCICA	SELA TURCICA	SELA TURCICA	SELA TURCICA
09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20
MASTOIDE 1	MASTOIDE 1	MASTOIDE 1	MASTOIDE 1	MASTOIDE 1
09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40
ORBITA 1	ORBITA 1	ORBITA 1	ORBITA 1	ORBITA 1
09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00
APARELHO URINARIO 2	APARELHO URINARIO	APARELHO URINARIO	APARELHO URINARIO	APARELHO URINARIO
10:00 AS 12:00 6	10:00 AS 11:40	10:00 AS 11:40	10:00 AS 11:40	10:00 AS 11:40
PELVE (QUADRIL)	PELVE (QUADRIL)	PELVE (QUADRIL)	PELVE (QUADRIL)	PELVE (QUADRIL)
ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20
MASTOIDE	MASTOIDE	MASTOIDE	MASTOIDE	MASTOIDE
13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40
FACE	FACE	FACE	FACE	FACE
13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00
COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL
14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20
COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA
14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40
COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR
14:40 AS 15:00	14:40 AS 15:40	14:40 AS 15:40	14:40 AS 15:40	14:40 AS 15:40
FACE	FACE	FACE	FACE	FACE
15:00: AS 16:20	15:00: AS 16:20	15:00: AS 16:20	15:00: AS 16:20	15:00: AS 16:20
CRANIO	CRANIO	CRANIO	CRANIO	CRANIO
16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00
TORAX	TORAX	TORAX	TORAX	TORAX

4. UNIDADE: UPA CIDADE DE DEUS – AP 4.0

Data da visita: 14/10

Responsável pela unidade: Ivania LGPD 13.709/2018

Horário de funcionamento do centro de imagem: 07h às 19h

Agenda SISREG: Sim

Identidade visual: Previsão 16/12

Gerador: Não possui

RH contratado: 3 técnicos em radiologia e 2 recepcionistas

Telelaudo implantado: Sim

Observação: Não há sala de espera para os usuários no Centro de Imagem

Segue abaixo a agenda SISREG:

SEGUNDA TC 1	TERÇA TC 1	QUARTA TC 1	QUINTA TC 1	SEXTA TC 1
08:00 AS 08:20	08:00 AS 08:21	08:00 AS 08:22	08:00 AS 08:23	08:00 AS 08:24
MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1	MEMBROS INFERIORES 1
08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40	08:20 AS 08:40
MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1	MEMBROS SUPERIORES 1
08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00	08:40 AS 09:00
SELA TURCICA	SELA TURCICA	SELA TURCICA	SELA TURCICA	SELA TURCICA
09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20	09:00 AS 09:20
MASTOIDE 1	MASTOIDE 1	MASTOIDE 1	MASTOIDE 1	MASTOIDE 1
09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40	09:20 AS 09:40
ORBITA 1	ORBITA 1	ORBITA 1	ORBITA 1	ORBITA 1
09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00	09:40 AS 10:00
APARELHO URINARIO 2	APARELHO URINARIO	APARELHO URINARIO	APARELHO URINARIO	APARELHO URINARIO
10:00 AS 12:00 6	10:00 AS 11:40	10:00 AS 11:40	10:00 AS 11:40	10:00 AS 11:40
PELVE [QUADRIL]	PELVE [QUADRIL]	PELVE [QUADRIL]	PELVE [QUADRIL]	PELVE [QUADRIL]
ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20	13:00 AS 13:20
MASTOIDE	MASTOIDE	MASTOIDE	MASTOIDE	MASTOIDE
13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40	13:20 AS 13:40
FACE	FACE	FACE	FACE	FACE
13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00	13:40 AS 14:00
COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL	COLUNA CERVICAL
14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20	14:00 AS 14:20
COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA	COLUNA TORACICA
14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40	14:20 AS 14:40
COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR	COLUNA LOMBAR
14:40 AS 15:00	14:40 AS 15:40	14:40 AS 15:40	14:40 AS 15:40	14:40 AS 15:40
FACE	FACE	FACE	FACE	FACE
15:00 AS 16:20	15:00 AS 16:20	15:00 AS 16:20	15:00 AS 16:20	15:00 AS 16:20
CRANIO	CRANIO	CRANIO	CRANIO	CRANIO
16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00	16:20 AS 17:00
TORAX	TORAX	TORAX	TORAX	TORAX

Total de exames laudados no período:

Exame	Quantidade de Exames
TC Abdome	17
TC Bacia	2
TC Coluna Cervical	2
TC Coluna Lombar	20
TC Coluna Sacra	4
TC Cranio	21
TC Pelve	12
TC Perna Direita	1
TC Pescoço	1
TC Torax	12
Total	92

5. UNIDADE: POLICLINICA MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA – AP 5.2

Data da visita: 11/10

Responsável pela unidade: Eliane

LGPD 13.709/2018

Horário de funcionamento do centro de imagem: 08h às 17h

Agenda SISREG: Sim

Identidade visual: Previsão 16/12

Gerador: Não possui

RH contratado: 2 técnicos em radiologia e 1 recepcionista

Telelaudo implantado: Sim

Total de exames laudados no período:

Nome	Quantidade
TC ABD SUP	1
TC ABDMEN SUP	1
TC ABDOMEN SUP	9
TC ABSOMEN SUP	1
TC APARELHO URINARIO	1
TC BACIA	2
TC COL CERVICAL	1
TC COLUNA CERVICAL	6
TC COLUNA DORSAL	4
TC COLUNA LOMBAR	16
TC CRANIO	20
TC DE TORAX	1
TC MASTOIDE	1
TC ORBITA	1
TC PELVE	11
TC SPN	1
TC TORAX	15
Total	92

Segue abaixo a produção das unidades onde já foi implantado o telelaudo no mês anterior (set/22)

1. UNIDADE: CF HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO – AP 4.0

Nome	Quantidade
ABDOMEN	1
BRAIN	1
LUNG	3
RECON PM	1
TC COL CERVICAL	1
TC PELVE	1
TC ABDOME	2

TC ABDOME E PELVE	9
TC ABDOME SUPERIOR	4
TC BACIA	1
TC COL DORSAL	1
TC COL CERVICAL	1
TC COL DORSAL	2
TC COLUNA CERVICAL	4
TC COLUNA LOMBAR	5
TC CRANIO	10
TC DE QUADRIL DIREITO	2
TC DE QUADRIL ESQUERDO	1
TC FACE	1
TC FEMUR ESQ	1
TC JOELHO DIREITO	1
TC JOELHO ESQUERDO	3
TC LOMBAR	4
TC MEMBRO INFERIOR ESQUERDO	1
TC OMBRO	1
TC OMBRO DIR	1
TC OMBRO ESQUERDO	1
TC PE ESQ	1
TC PELVE	10
TC PERNA ESQ	1
TC PERNA ESQUERDA	1
TC QUADRIL ESQ	1
TC SEIOS DA FACE	6
TC SPN	1
TC TORAX	54
TC TORNOZELO ESQ	1
TORAX	1
TOTAL	141

2. UNIDADE: CENTRO DIAGNÓSTICO ROCINHA – AP 2.1

Exame	Quantidade de Exames
TC Abdome	39
TC Art. Temp. Mandibular	2
TC Braço Direito	1
TC Coluna Cervical	11

TC Coluna Dorsal	9
TC Coluna Lombar	26
TC Cranio	28
TC Face	1
TC Joelho Direito	1
TC Mandíbula	1
TC Mastóides (ouvidos)	24
TC Ombro	2
TC Pelve	38
TC Seios da Face	15
Total	278

Cronograma de implantação de telelaudo:

AVANÇADAS	UNIDADE	TELE LAUDO
TIPO I	CF ADIB JATENE	14/dez
	CF OTTO ALVES	15/nov
	CMS BELIZARIO PENNA	09/dez
TIPO II	H M FRANCISCO DA SILVA TELLES	21/nov
	H M JESUS	24/nov
	H M PIEDADE	06/dez
	H M ROCHA FARIA	15/nov
	RONALDO GAZOLLA	05/dez
TIPO III	H M LOURENÇO JORGE	21/nov
	H M MIGUEL COUTO	05/dez
	H M SALGADO FILHO	28/nov

UNIDADE: H.M SOUZA AGUIAR - AP – 1.0


Demos início a adequação da estrutura física, contratação de RH, aquisição de mobiliário, computadores, implantação do serviço de telerradiologia que engloba a instalação de cabos de rede, instalação de câmeras de segurança, identidade visual, além da disponibilização de jalecos e crachás para todos os profissionais que atuam no setor de imagem independente do vínculo empregatício. Fizemos também a substituição de todo o mobiliário da sala da direção. Segue abaixo a lista com itens disponibilizados para a unidade:

Ítem físicos	Quantidade
Armário básico	3
Mesa de escritorio dir.	8
Mesa reunião gde dir.	1
Gaveteiro dir.	8
Cadeira rodízio dir.	14
Cadeira fixa dir.	4
Decoração dir.	N/A
Poltronas dir.	6
Mesa reunião peq. dir.	1
Mesa escritorio MDF (modelo AP)	13
Longarina cromada	12
Lixeira 20l	5
Lixeira 50l	5
Cadeira curvim fixa azul	9
Cadeira curvim rodízio azul	11
Armário (CATÁLOGO AP)	4
Armário Vitrine	2
Armário vestiário	15
Ar condicionado Split 21.000	2
Ar condicionado ACJ 21.000	1
Mesa redonda(Catálogo AP)	1
Mesa impressora (catálogo AP)	3
Maca USG	2
Dispenser Copo Descartável	1
Braçadeira p/ coleta	2
Cadeiras de Roda	5
Identidade Visual	N/A
Material Man. (vaso sanitário)	1
Saboneteira	15
Papeleira	15
Luminária	2
Material Instalação Ar-cond.	N/A
Espelho Convexo	1
Cubas	2
Computadores	8
Impressoras	1
Infra T.I	N/A
CF/TV	N/A

Abaixo relatório fotográfico

ANTES




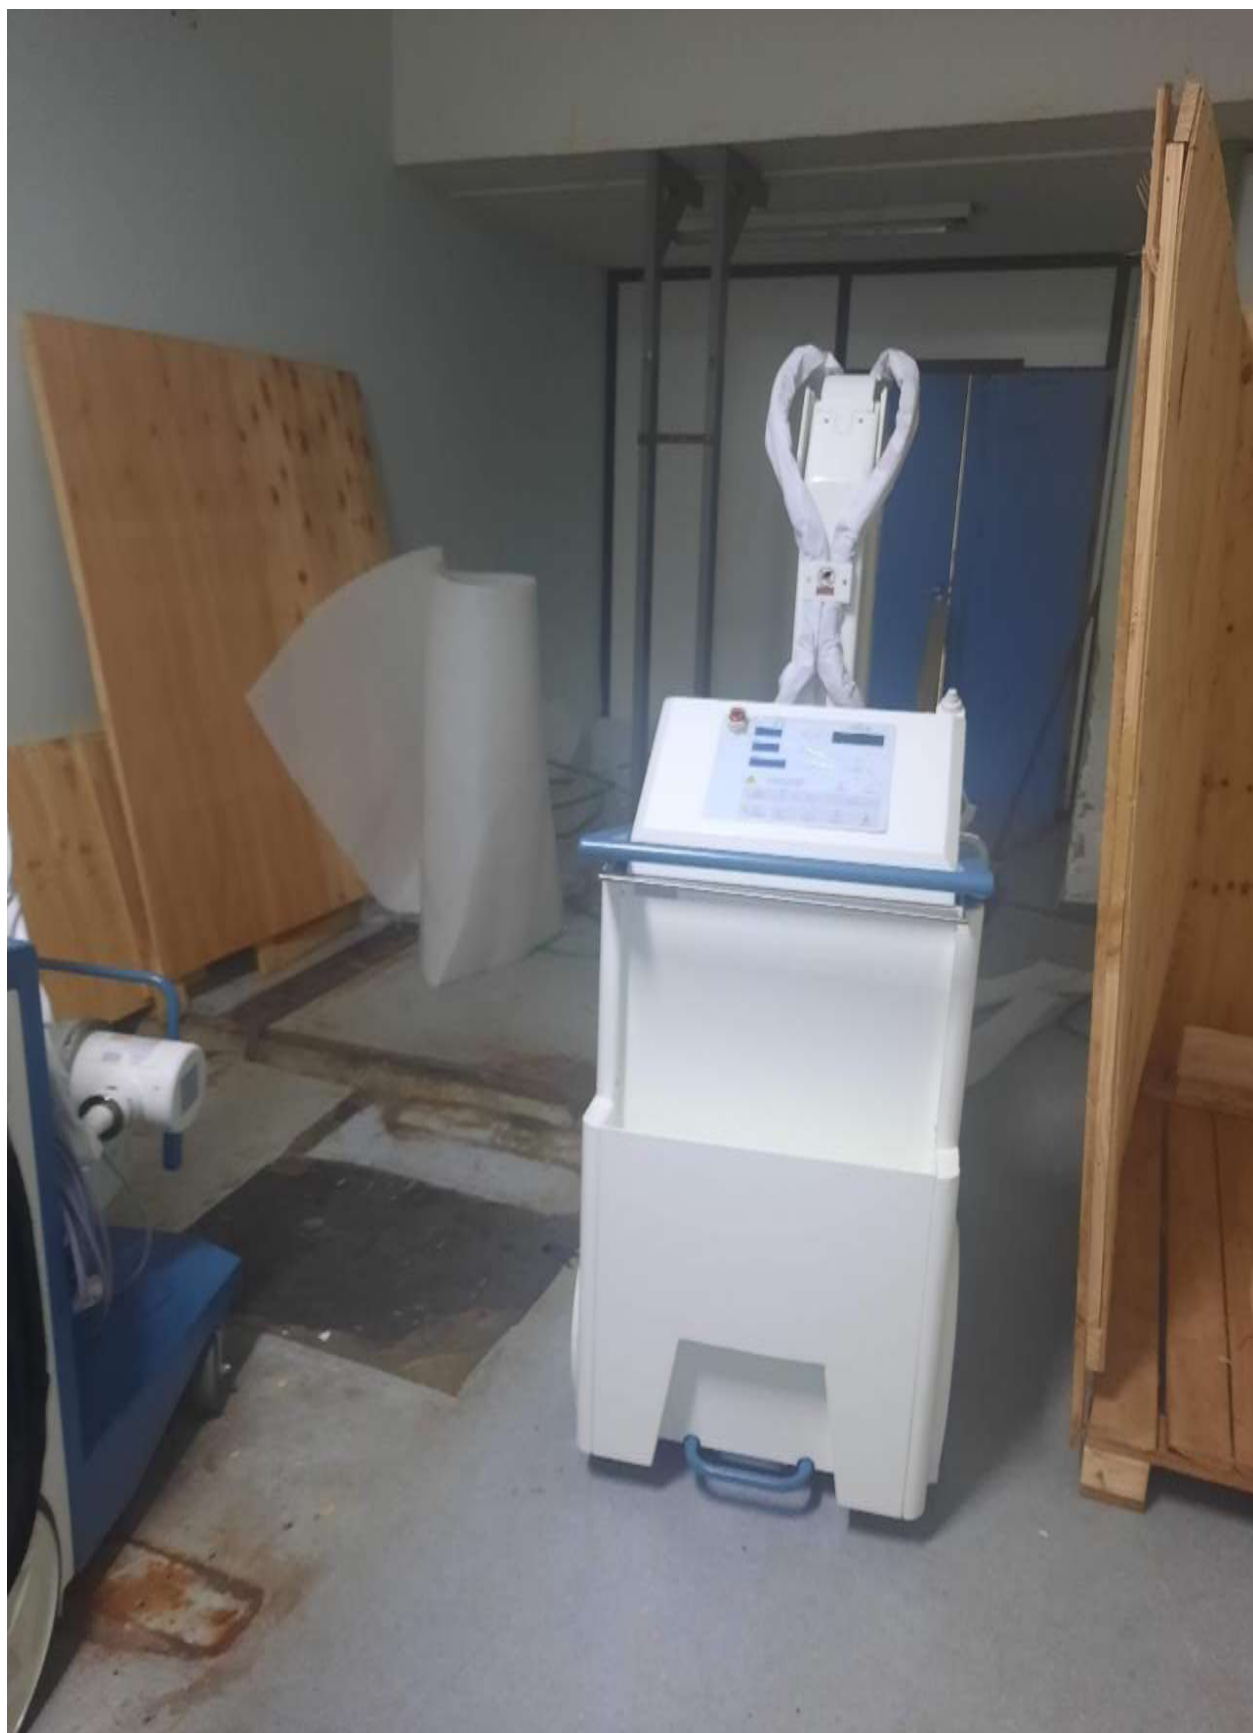








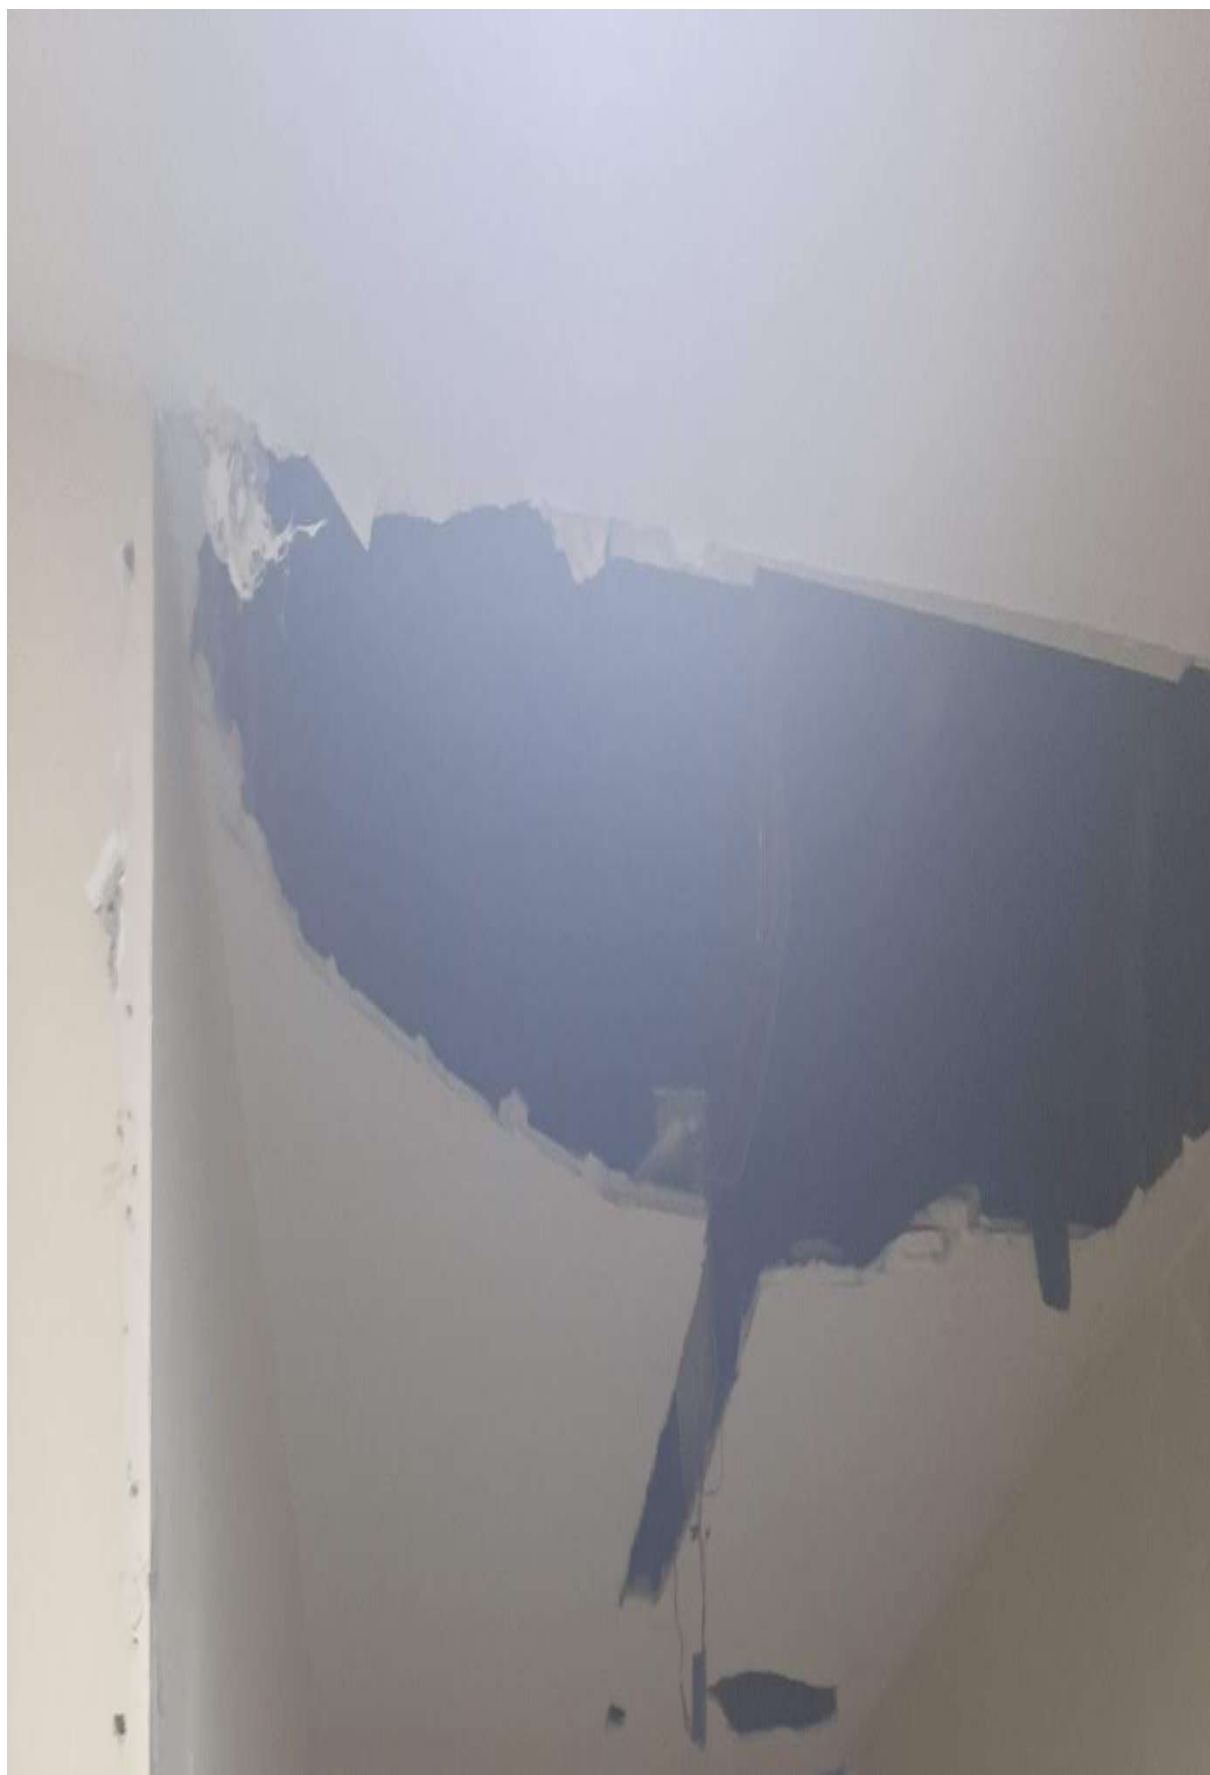






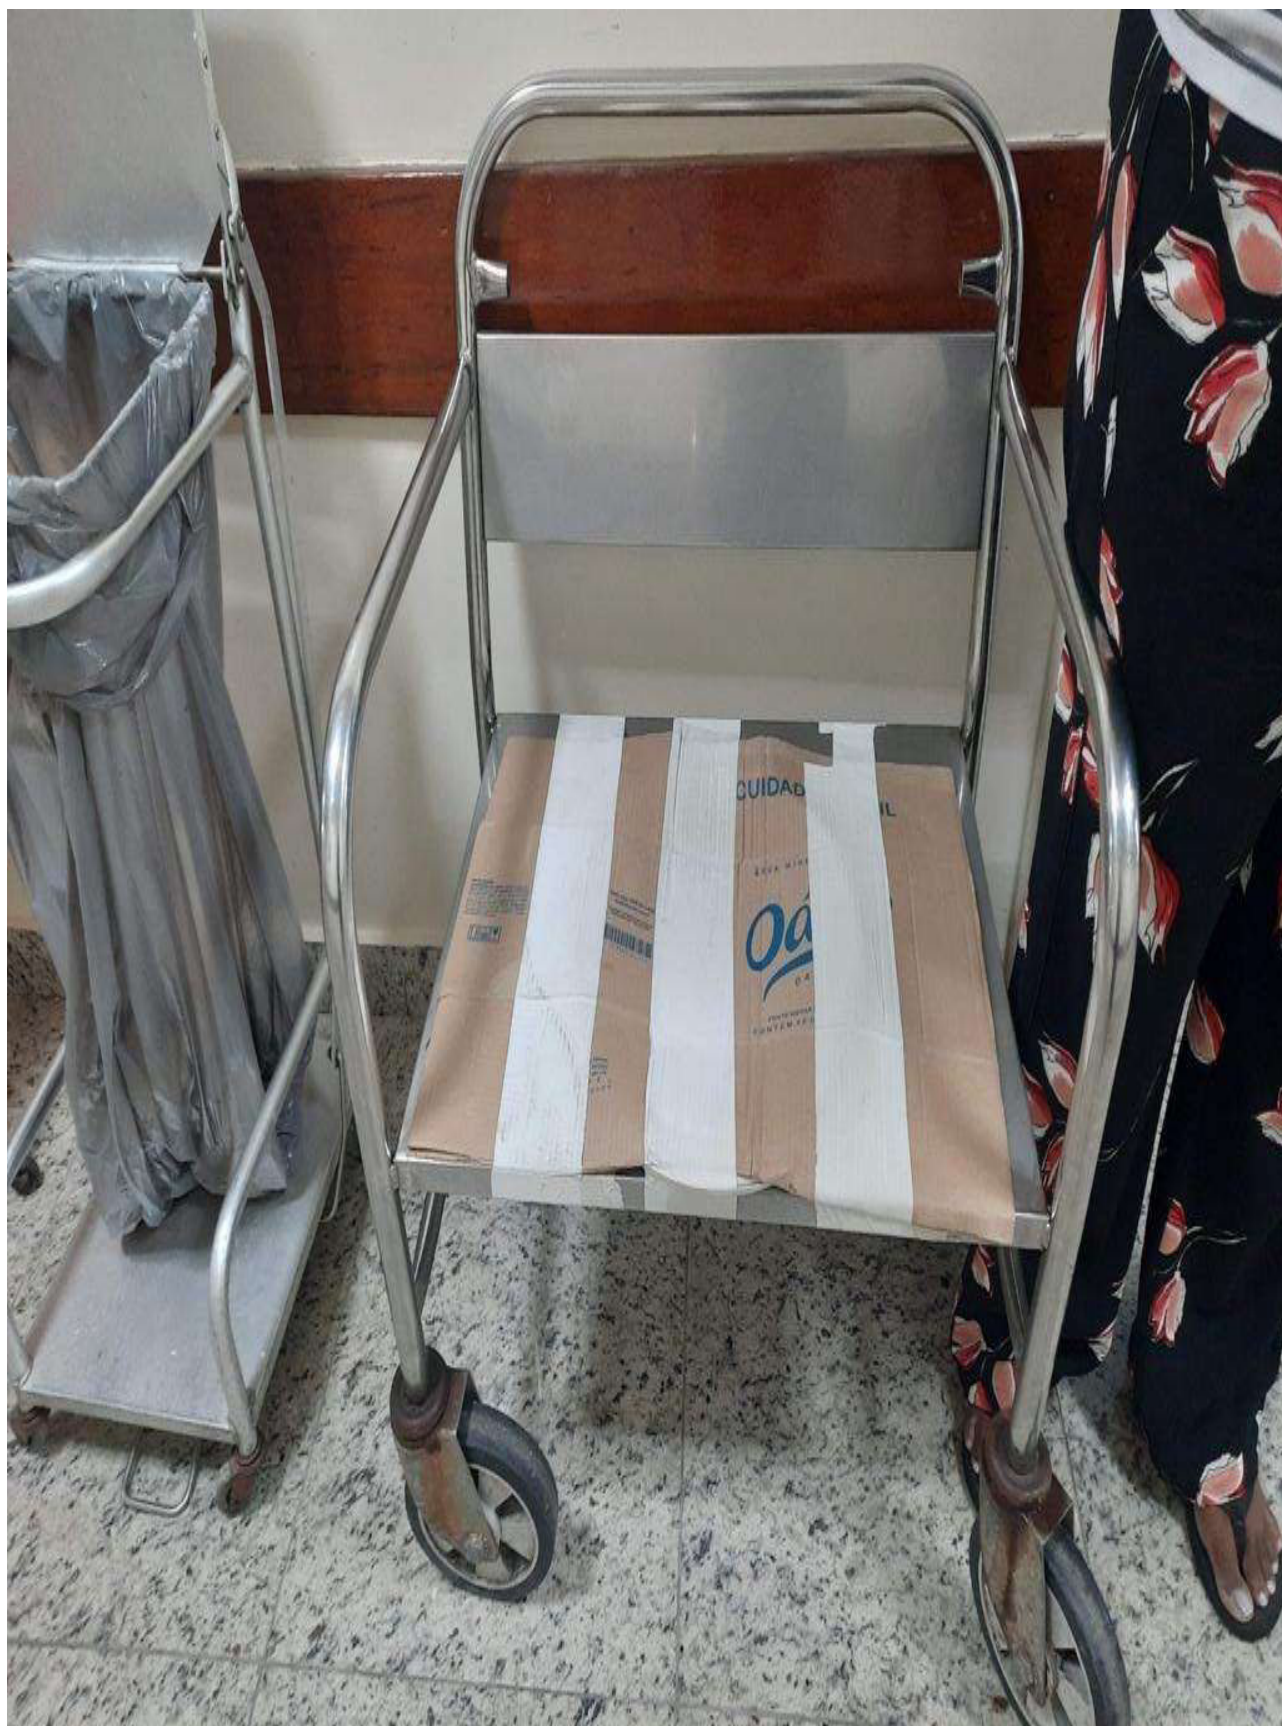



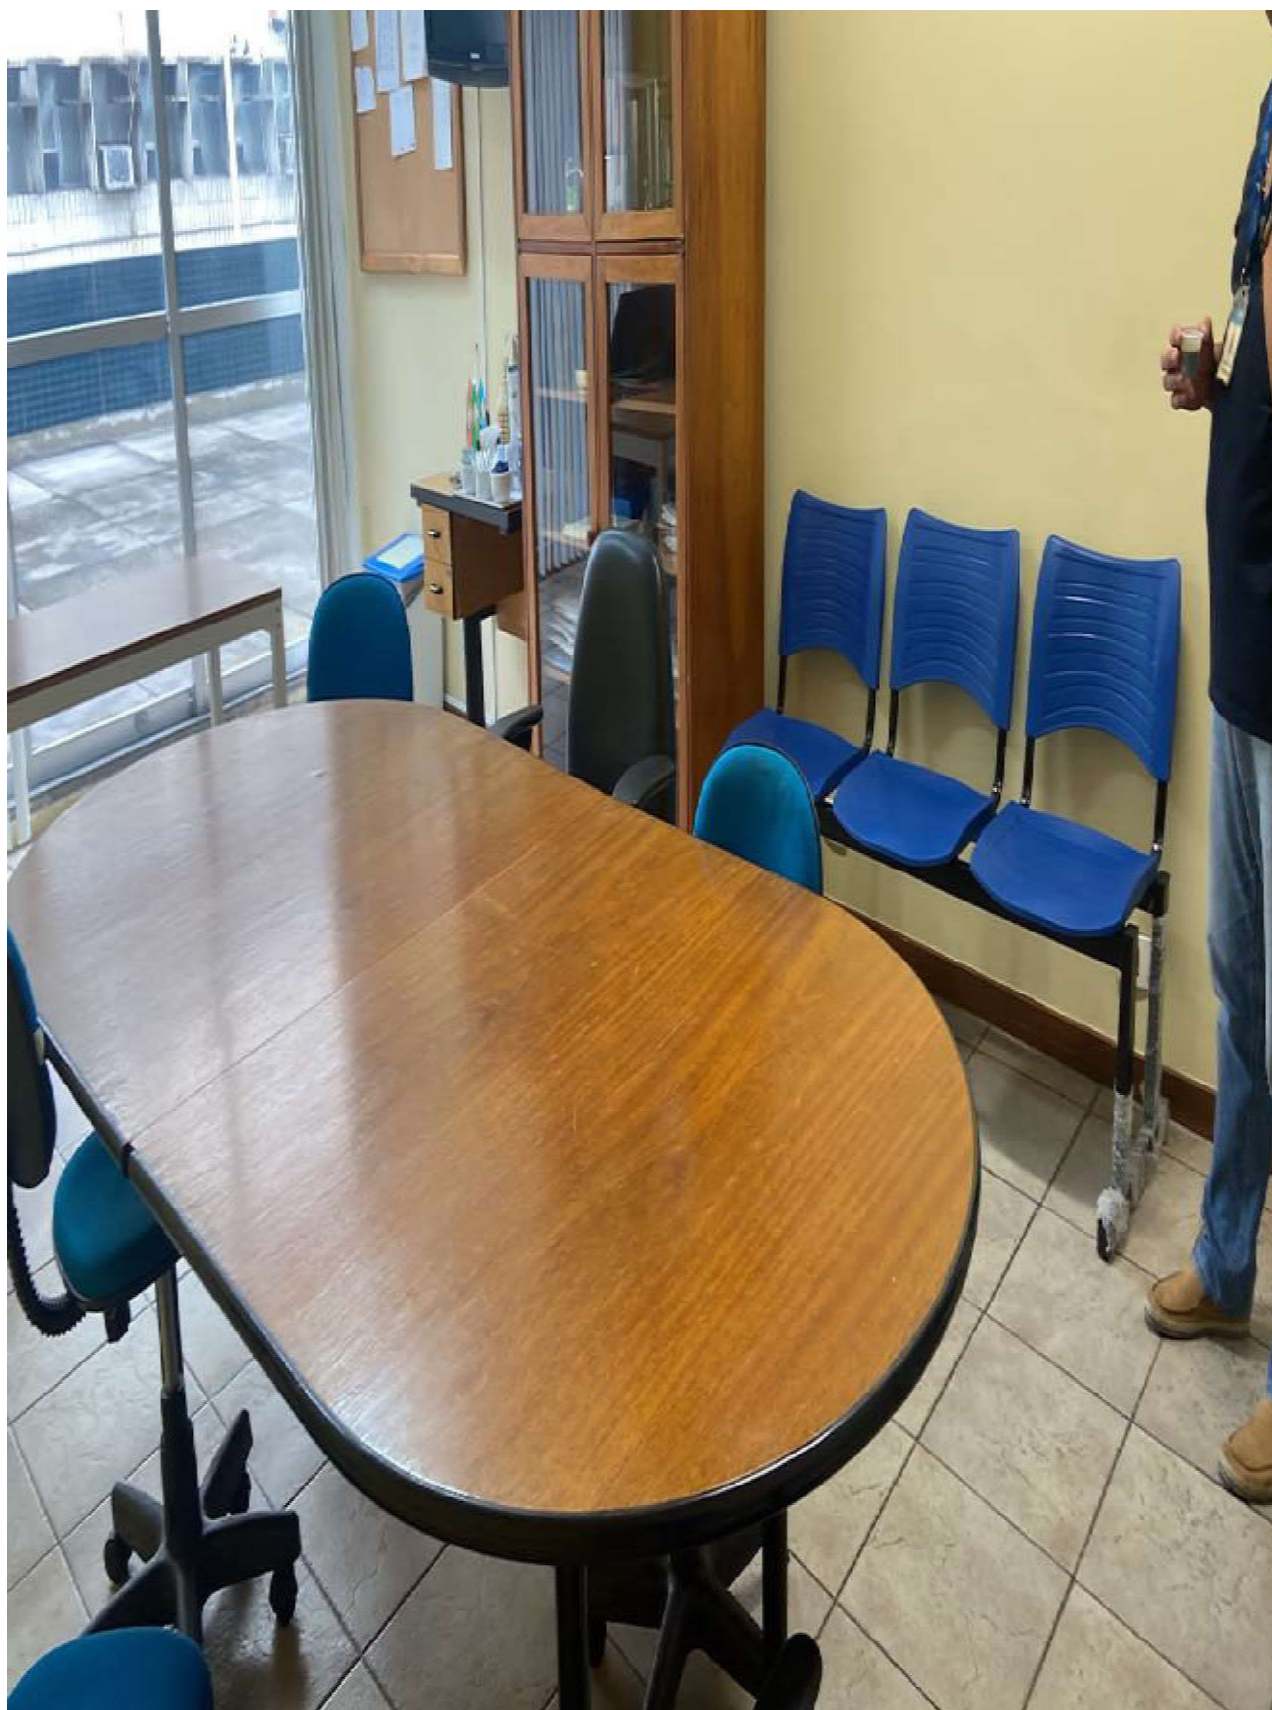






































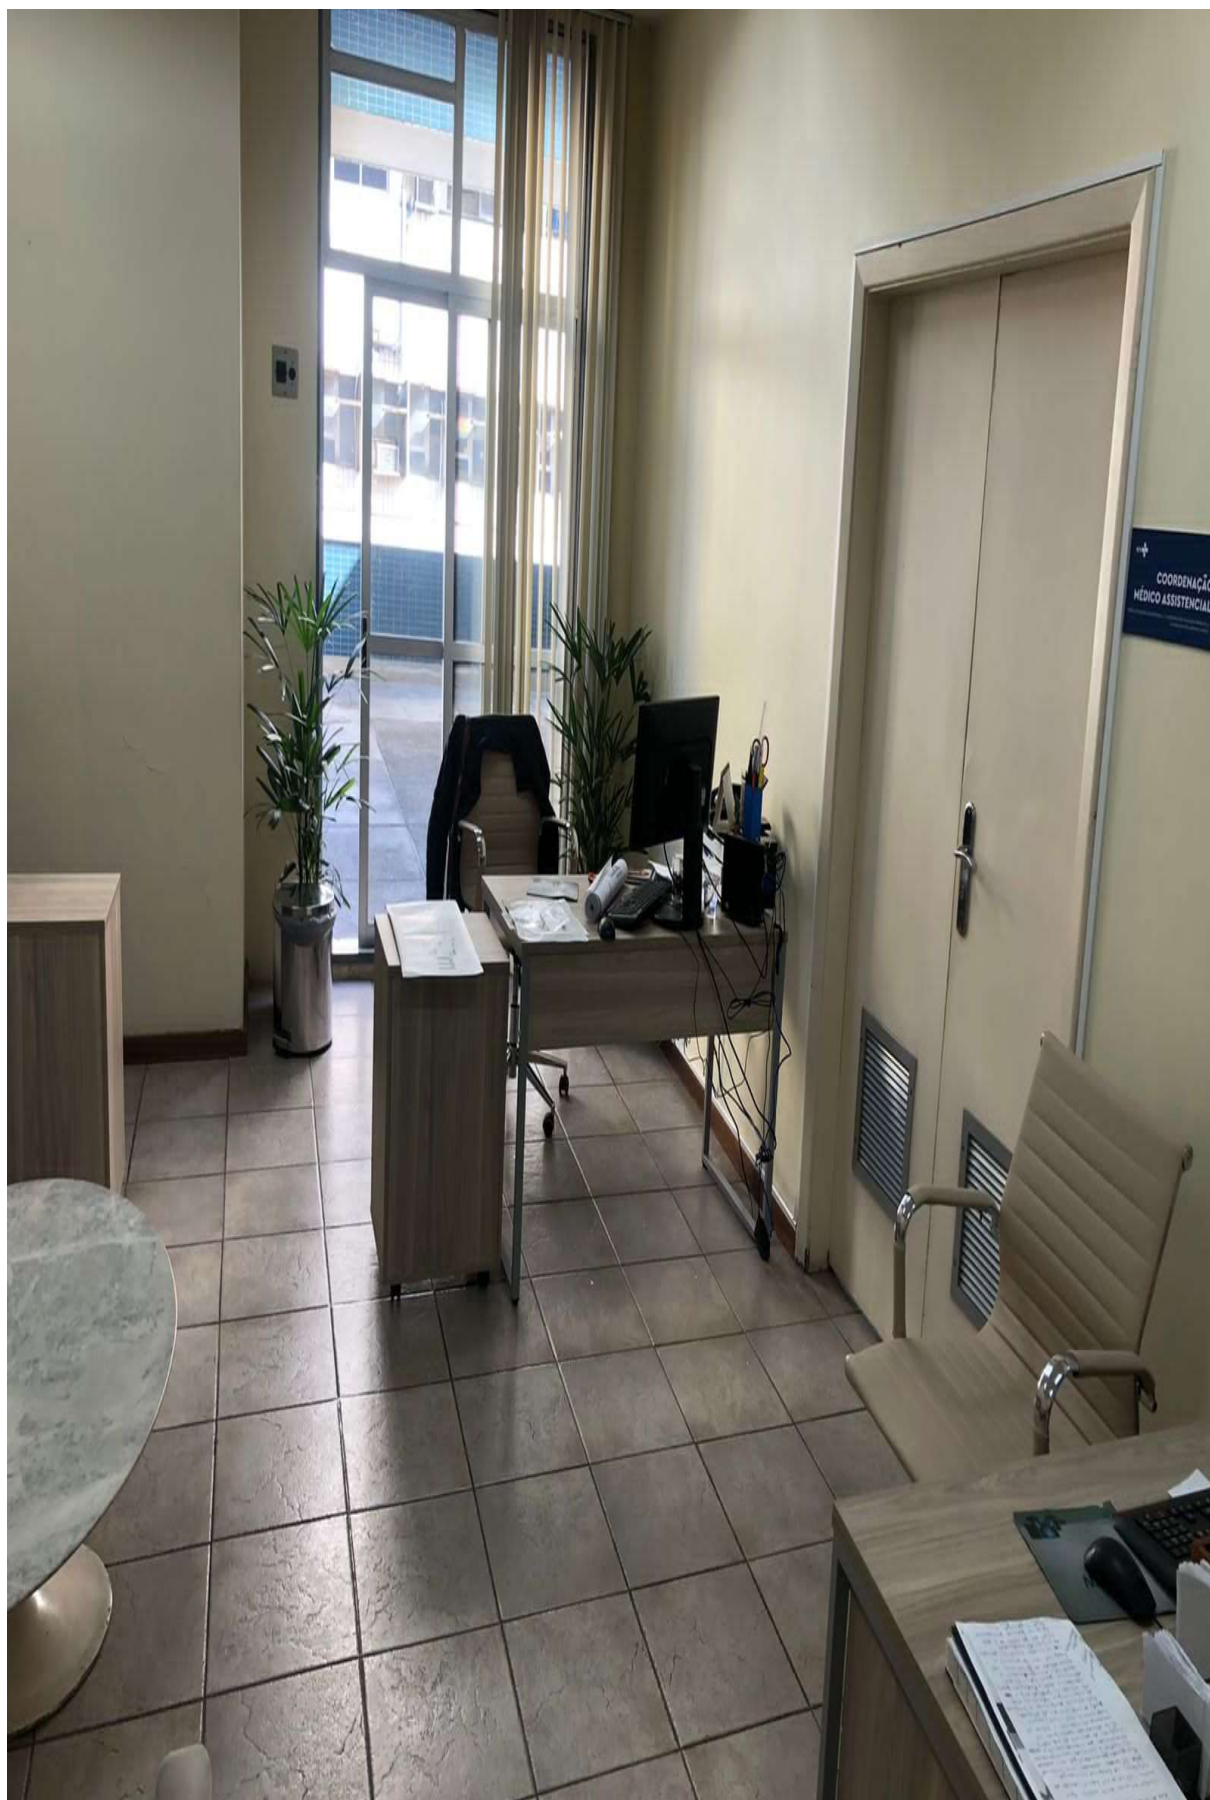

















2.6 Oficialização do serviço nos órgãos competentes:

O Departamento Jurídico do Instituto Gnosis está realizando a regularização do Centro Carioca de Diagnóstico junto aos órgãos públicos competentes. A busca prévia de local (CPL n.º 2022177673), que segue anexo, foi aprovada em 22/09/2022.

A Ata de Aprovação de Transferência do CNPJ 10.635.117/0004-48 para o endereço do CCD localizado na Rua Doutor Rodrigues de Santana, 53, Benfica, Rio de Janeiro está em processo de registro junto ao RCPJ. O Instituto Gnosis está aguardando a liberação do Registro da Ata Registrada pelo RCPJ para solicitar o Alvará de Funcionamento do estabelecimento, a Licença Sanitária e o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros.

2.7 Plano de implantação dos processos de trabalho da unidade:

Desde a assinatura do contrato foram realizadas reuniões com representantes da SMS e da Gnosis semanalmente, para determinação de processos relacionados a compra e informações referente ao andamento das obras e para mapeamento de processos. Realizado também reuniões semanais com os membros representantes do CCD para planejamento das atividades e inauguração da unidade.

No que tange a Tecnologia da Informação, foram realizadas reuniões com a equipe de desenvolvedores do sistema MV, para garantir que o mesmo para atenda de forma integral a demanda de prontuário eletrônico do CCD, além da implantação do Tele laudo através do sistema RIS PAX , inclusive nas unidades avançadas.

Foi realizada no Hospital Municipal Souza Aguiar a instalação de 1 (um) rack de equipamentos na sala da administração do centro de imagens, responsável por controlar a rede, o DVR e 2 (dois) links de internet, sendo 1 (um) de rádio e outro de fibra ótica. Foi disponibilizada rede em todas as salas de imagem, tanto de raios x, quanto de tomografias, no posto de enfermagem (2 pontos), na administração e na recepção (3 pontos). Um desses pontos de rede será utilizado para a instalação do ponto biométrico nos próximos dias.

Foram instalados 8 (oito) computadores, sendo 3 (três) na recepção, 2 (dois) na administração, 1(um) computador no posto de enfermagem, 1 (um) computador na sala de laudos e 1 (um) computador na sala de tomografia.

Ocorreu também a instalação de 1 (uma) impressora na recepção, além do sistema Medilab que será o responsável temporário pelo envio das imagens de exames para a nuvem virtual.

Foram apresentadas a equipe responsável pela elaboração do projeto da SMS as seguintes considerações sobre a sala de que irá acomodar os equipamentos e servidores de TI:

No térreo, onde serão alocados todos os servidores, equipamentos de telefonia, câmeras e internet, a sala deverá ter 3m de largura x 6m de comprimento, além de climatização que garanta a temperatura adequada da sala, uma vez que os equipamentos necessitam de refrigeração diferenciada das demais áreas comuns da unidade.

Foi solicitada ao setor de compras do Instituto a aquisição de 1 (um) nobreak de 10KVa com um banco de 6 (seis) baterias 24 Volts, como o padrão de interface de comunicação TCP/IP e software de monitoramento de carga do equipamento.

No que compete à contratação de serviços terceirizados especializados, temos a informar que o processo seletivo público se encontra em aberto, e tão logo for finalizado, enviaremos os contratos firmados junto aos terceiros, acompanhados de seus respectivos processos de cotação e do método de medição dos serviços.

Com intuito de garantir a contratação da equipe médica, estão sendo trabalhados Termos de Referência para a execução dos seguintes serviços: ultrassonografia com e sem doppler, ultrassonografia intervencionista, ecocardiografia, endoscopia digestiva alta e colonoscopia, anestesiologia, broncoscopia e espirometria.

Os Programas de qualidade e pesquisa de satisfação do usuário estão sendo elaborados e padronizados para aprovação da coordenação de SMS do CCD e implementação a partir da inauguração da unidade, com Totem de Pesquisa de Satisfação - com monitor touch-screen com interação em português e inglês, com identificação de paciente através do Cartão Nacional do SUS (CNS);

Diversos procedimentos operacionais padrão, procedimentos sistêmicos e fluxos de trabalho de algumas áreas críticas e protocolos e organização do serviço de imagem estão em andamento, sendo elaborados seguindo o PRQ EGQ 001 Controle de documentos.


Os regimentos Internos e demais documentações das instâncias obrigatórias estão em planejamento para implantação no primeiro trimestre após inauguração da unidade, conforme TC.

Em cumprimento com as exigências do termo de colaboração, e respeitando a Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS), o Instituto está elaborando o Plano Anual de Educação Permanente para o CCD e Unidades Avançadas para cumprir toda a meta legal de capacitações e atingir o público-alvo esperado, incluindo o corpo clínico e gerencial da unidade com proposta de temas de atividades, carga horária, métodos pedagógicos, categorias profissionais envolvidas e resultados esperados.

Temos como meta cumprir os indicadores de treinamento, não apenas o número de homens/hora treinados por mês, mas ainda a taxa de adesão, reação dos participantes ao treinamento, média da avaliação, aproveitamento individual, multiplicadores internos.

O Núcleo de Educação Permanente junto a equipe de Gestão da Qualidade, Coordenações e Área Técnica estão se reunindo semanalmente para o desenvolvimento do programa anual de Educação Permanente para o CCD. O planejamento dos treinamentos para 1º semestre de 2023.

Realizado Integração das equipes do CCD juntamente a SMS e o Instituto, com apresentação do Instituto Gnosis, missão, valores, visão, conduta ética, setores do Instituto, projetos institucionais, e o Centro Carioca de Diagnóstico. Apresentação dos riscos da unidade CCD, orientação sobre risco e perigo, fluxos de comunicação de acidentes típicos, de trajeto e com perfurocortantes, definições de EPI, noções básicas de combate a incêndio, identificação dos extintores. Seguem imagens:

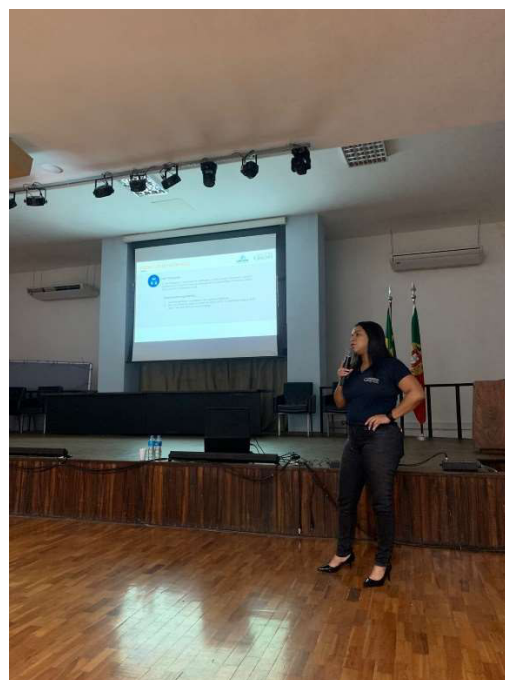

2.8 Termos de referência e Contratos:

Realizado análise e definição das necessidades contratuais, conforme determinações descritas no Termo de Colaboração Nº 09/2022. Após a definição dos serviços necessários, são elaboradas as minutas para os Termos de Referência, que passam por análise e aprovação do setor jurídico e área técnica para posterior abertura do processo de contratação, através de publicação no site do Instituto Instituto Gnosis, junto com o edital, para recebimento das documentações e posterior contratação da proposta com o menor preço e atendimento a todas as demandas descritas e solicitadas no TR. Resultado e Termo Contratual assinado são publicados no site do Instituto e lançados no Painel OSINFO.

Abaixo, segue o cenário completo:

SERVIÇO	Validação	Nº do Contrato	Situação
Coleta de resíduos	Enviado para validação em 28/06/2022		
Dedetização	Foi feito por compras	N/A	N/A
Esterilização		Aguardando a área técnica	
Fornecimento de gases	Enviado para validação em 28/06/2022		
Software de Imagem		N/A	N/A
Lavanderia Hospitalar		Aguardando definição da área técnica (descartável?)	
Link de Internet	Enviado para validação em 29/08/2022	049/2022	Já Instalado
Locação de computadores	Enviado para validação em 27/06/2022	047/2022	Equipamentos entregues dentro do prazo contratual
Locação de impressoras	Enviado para validação em 27/06/2022	048/2022	Equipamentos entregues dentro do prazo contratual
Telefonia	Enviado para validação em 06/09/2022	058/2022	Em implantação
CFTV para o CCD e as avançadas	Enviado para validação em 25/11/2022		Aguardando proposta
manutenção de ar condicionado		Aguardando especificações do equipamento	
Manutenção de gerador		Aguardando especificações do equipamento	
Manutenção predial		Aguardando o término da obra	
Locação de veículos		Aguardando definição da quantidade de veículos	
Software de Sistema de gestão com prontuário eletrônico	Enviado para validação em 28/06/2022	050/2022	Em implantação
Educação permanente		Aguardando a área técnica	
Serviço de Exames Admissionais	Enviado para validação em 21/07/2022	039/2022	Serviço em pleno funcionamento desde 15/08/2022
Prestação de serviços médicos PJ Individual	Enviado para validação em 22/07/2022	(deserto)	
Prestação de serviços médicos ECO e USG	Enviado para validação em 02/09/2022	cancelado	
Prestação de serviços médicos Anestesiologia	Enviado para validação em 02/09/2022	cancelado	
Prestação de serviços médicos Anestesiologia	Enviado para validação em 30/09/2022	cancelado	
Prestação de serviços médicos USG e USG intervencionista	Enviado para validação em 05/10/2022	cancelado	
Prestação de serviços médicos Endoscopia, Colonoscopia e Broncoscopia	Enviado para validação em 02/09/2022	cancelado	
Prestação de serviços médicos Anestesiologia	Enviado para validação em 17/11/2022		Processo aberto, aguardando proposta
Prestação de serviços médicos Endoscopia e Colonoscopia	Enviado para validação em 18/11/2022		Processo aberto, aguardando proposta
Prestação de serviços médicos Broncoscopia	Enviado para validação em 21/11/2022		Processo aberto, aguardando proposta
Prestação de serviços médicos Ecografia Vascular com Doppler e Ecocardiografia	Enviado para validação em 01/12/2022		Aguardando validação
Prestação de serviços médicos USG e USG intervencionista	Enviado para validação em 01/12/2022		Aguardando validação
Dosímetros	contratação pela modalidade tomada de preços	N/A	Equipamentos entregues dentro do prazo contratual
Radioproteção em radiologia, mamografia e tomografia computadorizada		Aguardando resposta se será CLT ou PJ	
Laboratório para realização de diagnóstico, anapatólogicos e de imuno	Enviado para validação em 22/11/2022		Aguardando validação
Auditoria		Aguardando a direção	
Manutenção de equipamentos médicos com fornecimento de peças		Aguardando área técnica (Qual o parque?)	
Manutenção preventiva e corretiva de elevador	Contrato com o próprio fabricante	N/A	Serviço em funcionamento desde 21/07/2022
Limpeza	Enviado para validação em 02/09/2022	051/2022	05/07/2022. Em 01/10/2022 iniciou o contrato
Portaria	Enviado para validação em 02/09/2022	055/2022	01/07/2022. Em 01/10/2022 iniciou o contrato
Vigilância	Enviado para validação em 17/11/2022	Aguardando validação	contratação emergencial desde 05/09/2022,

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Centro Diagnóstico Carioca representa para a saúde do Município do Rio de Janeiro, uma inovação técnica e de gestão que apresentará ao Brasil modelo de sucesso para o atendimento à população. A iniciativa atenderá substancialmente a demanda, por vezes reprimida ou mesmo desconhecida, através do acesso a exames e métodos de diagnóstico de média e alta complexidade, possibilitando o diagnóstico oportuno.

O Centro Carioca de Diagnóstico, juntamente com todo o complexo do Super Centro Carioca fará toda a diferença para a população do município do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto Gnosis iremos refletir o que será um exemplo de atendimento qualificado e humanização.

O Instituto Gnosis atua sempre prezando pelo atendimento pleno às expectativas das partes interessadas, humanizando a assistência aos usuários do SUS de forma comprometida, prezando pela qualidade de vida e desenvolvimento dos nossos colaboradores, elaborando e executando seus protocolos baseados no cuidado

centrado ao paciente, que prioriza sempre a segurança, a saúde e a satisfação dos usuários.

É necessário reforçar que durante esses 4 (quatro) primeiros meses de assinatura do Termo de Colaboração, o Centro Diagnóstico Carioca esteve em processo de obras para adequação das suas áreas e cumprimento das legislações vigentes, mantendo todo andamento alinhado com a coordenação representante da Secretaria Municipal de Saúde do Super Centro Carioca.

Juntamente com a realização das obras, todos os processos foram elaborados e planejados pelas respectivas áreas, assim como a capacitação das equipes contratadas, tanto quanto aos fluxos, processos e quanto a importância de um atendimento de excelência.

A equipe encontra-se empenhada em realizar os levantamentos pertinentes às necessidades para que o início da operação do projeto ocorra com a eficiência e qualidade exigida pelo contratante e necessidades dos usuários, assim como realizando a descrição dos processos integrados aos demais setores.

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, Gnosis tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados, com o intuito de oferecer aos usuários serviços de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Este relatório reflete os resultados apresentados no mês de novembro de 2022, onde as ferramentas e processos estão em fase de elaboração para implantação, até a finalização das obras, a fim de alcançarmos os resultados esperados para a tão ensejada inauguração do Centro Diagnóstico Carioca e alcance da missão de se tornar referência na especialidade da rede de atenção à saúde da capital carioca.

Thalita

LGPD 13.709/2018

Amendola

LGPD 13.709/2018

Instituto Gnosis

Apriadora técnica
